

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН



НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ТАДЖИКИСТАНА

ПРОЕКТ ПОВЫШЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

«План управления окружающей и социальной средой»

По подпроекту: SERSP-1С-16 «Капитальный ремонт здания типографии газеты “Зиндаги” для создания центра обучения молодежи в селе Ишкашим сельского джамоата Р.Юсуфбеков Ишкашимского района»



Апрель, 2021 год

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ.....	3
1. Введение.....	4
2. Цель подпроекта.....	6
ЧАСТЬ А: ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ И СТРОИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	7
ЧАСТЬ В: ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И СОЦИАЛЬНЫХ АСПЕКТАХ.....	17
ЧАСТЬ С: МЕРЫ ПО СМЯГЧЕНИЮ РИСКОВ	18
ЧАСТЬ D: ПЛАН МОНИТОРИНГА.....	34
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ	40

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

АСМ	Асбестосодержащий материал [АСМ]
ВБ	Всемирный Банк
ВОЗ	Всемирная Организация Здравоохранения
ГБАО	Горно-бадахшанская автономная область
ГН	Гендерное Насилие
КООС	Комитет по охране окружающей среды [СЕР]
КДП	Комиссия джамоата по проекту [JPC]
ЛЗП	Люди, затронутые проектом
МОС	Механизм обратной связи
МЗСЗН	Министерство Здравоохранения и Социальной Защиты Населения Республики Таджикистан
МТМЗН	Министерство Труда, Миграции и Занятости Населения Республики Таджикистан
МОН	Министерство Образования и Науки Республики Таджикистан
НСИФТ	Национальный социальный инвестиционный фонд Таджикистан
ПВЗС	План Взаимодействия с Заинтересованными сторонами
ОПП	Основы политики переселения
ОВОСС	Оценка воздействия на окружающую и социальную сферу [ESIA]
ПГТ	Посёлок городского типа (городок)
ПРП	Партнер по реализации проекта [IP]
ПДП	План действий по переселению
ТГЗ	Профессионально-технический лицей
ППСЭУ	Проект повышения социально-экономической устойчивости
ПУОСС	План управления окружающей и социальной средой [ESMP]
РДООССВ	Рамочный документ охраны окружающей среды и социальным вопросам [ESMF]
СИЗ	Средства Индивидуальной Защиты
СЦЗ	Сельский центр здоровья
ТБО	Твёрдые бытовые отходы
ТГЗ	Типографии газеты “Зиндаги”
НПО	Неправительственная организация
ТГЗ	Центр дополнительного образования
ЦОВ	Центр обучения взрослых
ЦУП	Центр управления проектом
ЭКО	Экологическая и социальная оценка [ESA]
СЭС	Социально экологические стандарты
ГЭЭ	Государственная экологическая экспертиза

1. Введение

Цели развития Проекта повышения социально-экономической устойчивости (ППСЭУ) состоят в том, чтобы укрепить местное самоуправление на основе широкого участия, улучшить качество местной инфраструктуры в целевых сообществах и расширить возможности для внеклассного обучения или получения средств к существованию для молодежи. Проект состоит из трех взаимосвязанных компонентов.

Компонент 1 предусматривает субгранты для финансирования социально-экономической инфраструктуры на местном уровне, которые направлены на решение приоритетных задач, определенных в ходе оценки потребностей сельских районов и процесса принятия решений на основе широкого участия. В рамках данного компонента будет также наращиваться потенциал администраций джамоатов и общинных учреждений. Основное внимание уделяется поддержке мобилизации сообществ и молодежи в целевых районах, с целью их вовлечения в процесс принятия решений о субгрантах и их постоянному вовлечению в цикл каждого подпроекта.

Компонент 2 проекта предусматривает проведение мероприятий в интересах нетрудоустроенных юношей и девушек с низким уровнем социально-экономического благополучия в целях повышения их общей устойчивости к таким рискам, как социальное отчуждение, бездеятельность и разочарованность. Данный компонент будет финансировать оказание инклюзивных услуг для молодежи и реабилитацию молодежных и общественных помещений, а также проведение тренингов по вопросам обеспечения источников средств к существованию, и приобретение инструментов и оборудование для осуществления мероприятий по обеспечению источников средств к существованию в семи целевых районах ГБАО и Хатлонской области.

В рамках компонента 3 будут финансироваться управление проектом, мониторинг и оценка, и наращивание потенциала.

Данный проект будет способствовать достижению более высоких целей в рамках Программы «Режима снижения рисков» (РСР) Всемирного банка, связанных с повышением устойчивости, которая определяется в качестве способности человека, сообщества и/или страны приспосабливаться к трудностям, неблагоприятным воздействиям и/или внешним потрясениям либо реагировать на них, а также устранять их, что в свою очередь позволит уменьшить степень уязвимости перед такими вызовами и предотвращать дальнейшие риски возникновения неустойчивости.

Потенциальные экологические воздействия.

Предполагаемая деятельность по проекту в рамках Компонентов 1 и 2 может привести к экологическим последствиям, связанным с шумом, пылью, загрязнением воздуха и воды, управлением твердыми отходами, деградацией биоразнообразия, опасностями для здоровья и проблемами в сфере охраны труда и т.д. Ожидается, что экологические риски будут типичными для небольших

инфраструктурных подпроектов и восстановительных работ по созданию центров обучения молодежи. Проектные мероприятия будут временными по своей природе и ограничены площадью участков. Все последствия могут быть соответствующим образом смягчены посредством применения наилучших методов строительства и соответствующих смягчающих мер. Риск стихийных бедствий и климатических потрясений высокий, в связи с чем проект будет включать наращивание потенциала местных субъектов по ряду соответствующих вопросов, касающихся уязвимости, конфликтов и насилия, и управления рисками бедствий, с участием местных и общинных учреждений, а также официальных и неофициальных лидеров.

Потенциальные социальные воздействия и вопросы переселения.

Проект направлен на улучшение социально-экономической инклюзии целевых уязвимых групп населения, а также молодых мужчин и женщин. Компонент 1 будет способствовать улучшению доступа к транспорту/питьевому водоснабжению/электричеству/или ирригации в целевых общинах, а также будет работать с махаллинскими комитетами или джамоатами для повышения их эффективности и оперативности реагирования на нужды членов сообществ. В рамках Компонента 2 проекта будет увеличено участие молодых мужчин и женщин в гражданской деятельности, обучении, индивидуальной трудовой деятельности или предпринимательской деятельности. Предполагаемая деятельность по проекту в рамках Компонентов 1 и 2 может привести к негативным социальным последствиям, связанным с временным ограничением доступа, приобретением земли, добровольной передаче земли, ожиданиями соседнего сообщества в отношении совместного использования выгод, неполным социальным охватом, неэффективностью социального посредничества в деле сокращения масштабов бедности, неэффективным управлением инвестициями в поддержку местных сообществ, рисками, связанными с управлением и борьбой с коррупцией, трудовыми рисками и связанные с этим насилие на основе гендерного различия, охраной здоровья и безопасности.

В целях предотвращения экологических и социальных рисков в рамках реализации “Проекта повышения социально-экономической устойчивости” НСИФТ разработал Рамочный документ по охране окружающей среды и социальным вопросам (РДОССВ) в соответствии с требованиями Всемирного банка и обнародовал его внутри страны во время общественных консультаций 13 марта 2019 года в городе Кулябе, 14 марта 2019 г. в Пянджском районе Хатлонской области; онлайн-консультации с заинтересованными сторонами в ГБАО были объявлены 10 апреля 2019 года. Окончательная версия РДОССВ была опубликована на сайте НСИФТ 15 апреля 2019 г. (www.nsift.tj). Версия РДОССВ была официально представлена для публикации на английском языке на внешнем веб-сайте ВБ в апреле 2019 года.

2. Цель подпроекта

Цель данного подпроекта заключается в том, чтобы укрепить местное самоуправление на основе широкого участия, улучшить качество местной инфраструктуры в целевых сообществах и расширить возможности для внеклассного обучения или получения средств к существованию молодежи в Кулябской зоне. Основная цель разработки Плана управления окружающей и социальной средой (ПУОСС) заключается в том, чтобы избежать, свести к минимуму или смягчить потенциальные негативные воздействия на окружающую среду и социальные последствия, вызванные в результате реализации подпроекта. Данный ПУОСС позволит обеспечить проведение надлежащей оценки разработанных подпроектов с экологической и социальной точек зрения и на предмет их соответствия утвержденным ВБ экологическим и социальным стандартам, а также законам и нормативно-правовым актам Республики Таджикистан в сфере охраны окружающей среды и социальных вопросов, с целью достаточного смягчения каких-либо остаточных и/или неизбежных воздействий. Кроме того, в нем содержатся рекомендации по проведению экологического и социального мониторинга и подготовке соответствующей отчетности. Цель этого контрольного перечня заключается в том, что он будет применяться в качестве руководящих принципов для подрядчиков малых работ и является неотъемлемой частью тендерной документации для подрядчиков, выполняющих небольшие строительные работы в рамках проектов, финансируемых Банком.

В рамках реализации компонента 1С запланировано создание 17 центров обучения молодежи, из них в 6 объектах предусмотрено новое строительство, в 9 объектах - проведение капитального ремонта и в 2 - мелкий ремонт в целевых районах ГБАО (Вандж, Шугнан и Ишкашим) и Хатлонской области (Хамадони, Фархор, Пяндж и г. Куляб).

В связи с этим, для каждого объекта по проведению капитальных ремонтов предусмотрено разработать План управления окружающей и социальной средой (ПУОСС).

ЧАСТЬ А: ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ И СТРОИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

1А. Институциональные и административные данные.			
Страна	Таджикистан		
Название Проекта	Проект повышения социально- экономической устойчивости (ППСЭУ) в Таджикистане.		
Исполнитель Проекта	Национальный социальный инвестиционный фонд Таджикистана (НСИФТ)		
Охват проекта и проектной деятельности	ППСЭУ охватывает 7 районов двух областей: Хатлонской области и Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Республики Таджикистан и направлен на улучшение социально-экономической инфраструктуры районов и развитие современных навыков целевых уязвимых групп, в частности молодых женщин и мужчин, которые не охвачены обучением и трудовой деятельностью, граничащих с Исламской Республикой Афганистан.		
Сфера деятельности участка/объекта	Типография газеты «Зиндаги» (ТГЗ) в селе Ишкошим (райцентр) сельского джамоата Р. Юсуфбеков района Ишкашим, Горно-Бадахшанская Автономная Область. Предусмотрено на базе ТГЗ создание Центра обучения для молодежи районного центра и близ расположенных джамоатов района.		
Институциональные механизмы (имя и контактные данные)	Всемирный банк: Руководитель проекта: Роберт Вробель rwrobel@worldbank.org	НСИФТ: Координатор ППСЭУ: Рахматуллоев О. orazbuda1982@gmail.com	
Механизмы реализации (имя и контактные данные)	Надзор за экологическими и социальными рискам НСИФТ Главный специалист по экологическим и социальным мерам безопасности НСИФТ в городе Душанбе Нетьматов Зафар: Эл.почта: nematov.zafar-1968@mail.ru Моб.тел: +992-918-98-56-43 Главный специалист по экологическим и социальным мерам безопасности в представительстве НСИФТ в г.Хороге Рохила Назарбекова: e-mail: rohila.nazarbekova@gmail.com Моб.тел: +992 93-173-17-43	Подрядчик: (подлежит к определению)	Государственный надзор

2А. Описание строительного участка

Название участка (подпроект)	SERSP-1С-16: «Капитальный ремонт здания типографии газеты “Зиндаги” для создания центра обучения молодежи в селе Ишкашим сельского джамоата Р.Юсуфбеков Ишкашимского района»
Описание местоположения объекта, включая приложение с картой объекта	<p>Адрес: Республика Таджикистан Горно-Бадахшанская Автономная Область, район Ишкашим, сельский джамоат Р.Юсуфбеков, село Ишкашим (райцентр), улица М.Бобокова 7.</p> <p>Здание типографии газеты “Зиндаги” находится в районном центре района Ишкашим (координаты расположения: N°36°43,34-E°71°36,51)</p> <p>Напротив здания Типографии газеты «Зиндаги» (ТГЗ) через магистральную автодорогу Ишкашим-Хорог-Душанбе на расстоянии около 50 метров находится здание Хукумата района Ишкашим, в целом вокруг ТГЗ находятся здания государственных учреждений района, а жилые дома находятся на расстоянии 250-300 метров юго-западной части местности.</p> 
Кому принадлежит земля?	Земля в Республике Таджикистан является исключительно собственностью государства, и государство гарантирует эффективное её использования в интересах народа.
Кто использует землю (формально / неформально)?	Используемая земля типографии газеты “Зиндаги” имеет свидетельство землепользователя на 0,075 га, выданное со стороны государственного органа по управлению землей Хукумата района Ишкашим 12 марта 2021 года №662 (номер кадастры 54-007-000128)
Описание вопросов географического, физического,	<u>Географическое описание:</u> Типография газеты “Зиндаги” расположена в районном центре Ишкашимского района, который является районом на востоке Республики

биологического, геологического, гидрографического и социально-экономического характера

Таджикистан, расположенным на крайнем юго-западе ГБАО. Граничит с Афганистаном на юге и западе по реке Пяндж. Население Ишкашимского района составляет 30853 человека (2015 год). Район имеет примерно V-образную форму и расположен к северо-востоку от реки Пяндж, где ее русло поворачивается с запада на север. Граничит на юге и западе Афганистана через реку Пяндж и нижний Памир, на севере - с Рошткалинским районом. На севере есть небольшие границы с Шугнанским районом и на востоке – с Мургабским районом. Хребет Шахдара расположен вдоль северной границы с Рошткалинским районом, а Ишкашимский хребет - вдоль северной и юго-восточной границы района. Районным центром является поселок Ишкашим, расположенный в излучине реки Пяндж, напротив одноименного Ишкашимского района, расположенного в Афганистане.

Климатическая характеристика Ишкашимского района взята из данных метеостанции ГБАО:

Таблица 1. Основные характеристики климата в Ишкашимском районе

Температура окружающей среды (на открытом воздухе)	Минимум:	-45°C и более
	Максимум:	+30°C и более
	Среднее дневное значение:	+19,5°C и более в июле
	Среднегодовое значение:	+7,5° C
Относительная влажность	январь - 80%, июль - 40%, очень засушливо	
Среднее количество осадков:	От 100-200 мм и от 400 до 800 мм.	
Количество дней с дождевым туманом:	Около 100 дней	
Максимальная солнечная радиация:	От 2,500 до 2,800 часов и более	
Максимальная температура почвы:	Более 36° C	
Приземная температура	От 32°C до 36°C и может быть больше (июль).	
Высота (метров над уровнем моря):	до 1000 метров	
Скорость ветра:	до 2,1 м/сек.	
Сейсмичность района	9 баллов	

В Ишкашимском районе зима достаточно суровая, при этом температура воздуха достигает до -45°C и менее, максимальная летняя достигает +25°C. Количество выпадающих осадков в виде снега больше, чем в центральных районах страны, и осадки в виде дождя выпадают в основном с марта по май. Снежный покров

держится на почве 90 дней в году на высоте более 2000 м над уровнем моря. Нормативная снеговая нагрузка составляет 70-100 кг/м². Общее среднегодовое количество осадков в Ишкашимском районе составляет от 100 мм до 800 мм и наибольшей степени подвержен риску стихийных бедствий, таких как землетрясения сейсмичность баллов достигшее 9 баллов, которые также могут вызвать снежные лавины, оползни, сели и наводнения. Изменение климата привело к увеличению частоты и интенсивности экстремальных погодных явлений, особенно интенсивных снеговых осадков.

Физическое описание: Здание типографии газеты “Зиндаги” было построено в 1989 году со стороны Хукумата района Ишкашим именно для выпуска газет и журналов.



Фото: Здание центра типографии газеты “Зиндаги”

Данное здание было построено по меркам 90-х годов прошлого века, то есть фундамент железобетонный, стены выполнены из цементных блоков, перекрытия этажей из железобетонных пустотных плит, полы полудеревянные, частично из линолеума, оконные и деревянные блоки стандартные, также кровля по тем временам традиционная, то есть мягкая кровля.

В настоящее время техническое состояние относительно удовлетворительное, так как в течение более 30 лет существования здания, мероприятия по проведению капитального ремонта из-за отсутствия финансовых средств Хукумата района не проводились.



Фото: Аварийное состояние кровли здания ТГЗ

Особенно на протяжении многих последних лет существующая мягкая кровля (битумная кровля) здания стало непригодной и в период дождевых и снеговых осадков вода проникает внутрь здания, такая ситуация может привести здание к аварийному состоянию.

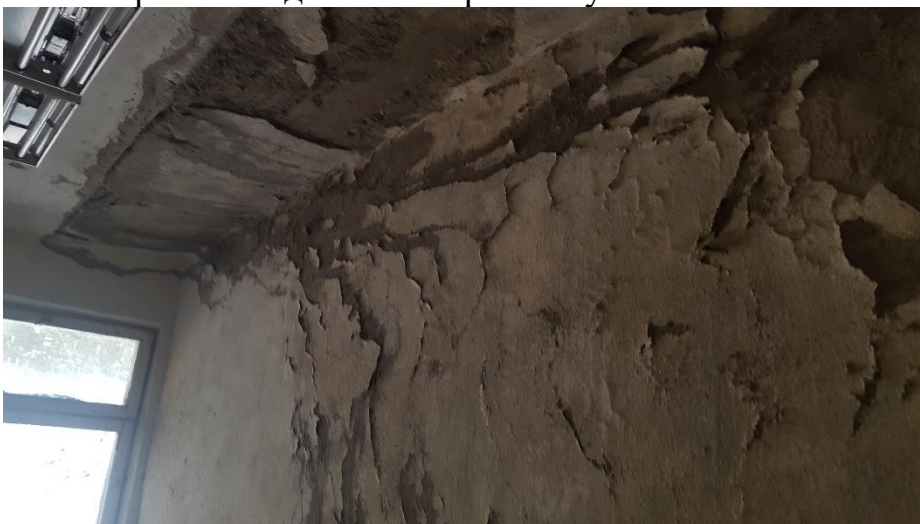


Фото: Аварийное состояние внутри второго этажа здания ТГЗ

В связи с этим, в рамках реализации подпроекта SERSP-1С-16 по созданию центра обучения молодежи (ЦОМ) предусмотрено проведение капитального ремонта не только трёх помещений для ЦОМ, но и всего здания. Запланированные мероприятия будет производиться на основе дефектного акта и разработанных чертежей со стороны инженеров НСИФТ, в которых предусматривается устройство новой четырёх скатной кровли площадью 320 м² из окрашенных профильных стальных листов t-0,5мм, ремонтные работы по замене оконных и дверных блоков, потолков и полов, системы внутреннего электроснабжения, отделочные работы внутренних и наружных стен. Продолжительность

капитального ремонта по подпроекту SERSP-1C-16 составляет 4 месяца.

Биологическое описание: Биологическая среда района с удивительно разнообразным многообразием фауны и флоры находятся за пределами зоны проектного воздействия.

Геологическое описание: Геологическая структура является сложной в связи с расположением вблизи тектонической границы основного надвигового типа между структурами Центрального и Северного Памира, состоящей из различных пород от деформированных и метаморфозированных предкамбрийских и палеозойских сланцев. Почвы в основном состоят из отложений, эродированных с гор и состоящих из чередующихся слоёв гравия, песка, ила и глин. В осадочных породах, примыкающих к горам, преобладают крупные отложения, такие как галька и щебень, оседающие под действием сточных вод с гор.

Гидрографическое описание: Гидрографическое состояние района Ишкашим относится к бассейну реки Пяндж, которая разделяет границы между странами Таджикистан (правый берег) и Афганистан (левый берег). Река Пяндж образуется при слиянии рек Памир и Вахандарья и сливаясь с рекой Вахш образуется в реку Амударья. Источником питания реки Пяндж является ледниковые, подземные, снеговые и дождевые воды. Неглубокое залегание грунтовых вод обусловлено естественным выклиниванием, слабой дренированностью данных участков и фильтрацией воды из оросительной сети. Основной причиной подъема уровня грунтовых вод является выход из строя или засыпка существовавшей ранее дренажной системы, как на застроенной территории, так и за ее пределами.

Социально-экономическое описание: Ишкашимский район ГБАО расположен от города Хорог на расстоянии 115 км и от города Душанбе на расстоянии 719 км.

Районным центром является посёлок Ишкашим, который входит в состав джамоата Р.Юсуфбеков, а также имеет 6 сельских джамоатов, в которые входят 46 сёл. Общее количество населения района составляет 30894 людей. Из общего количества населения, около 20% составляют молодые люди в возрасте от 15 до 30 лет. Основная часть населения занята в сельском хозяйстве.

	Источником дохода населения района является земледелие, животноводство, садоводство, трудовая миграция и работа в государственных учреждениях.
Месторасположение и расстояние от пункта материального снабжения, особенно, агрегатов, воды, камней	Строительные материалы: цемент, жженый кирпич, пило/материалы, оконные, дверные проёмы, все отделочные материалы, а также необходимые материалы будут поставляться из города Душанбе на расстояние 719 км. Инертные материалы (песок, щебень) на объект будут доставляться из действующего карьера Шугнанского района на расстоянии 145 км.

Законодательство

Уточнить национальное и местное законодательство и разрешения, которые применяются к проектной деятельности	<i>Перечень национальных законов и нормативов</i>	
	<i>Таблица 1</i>	
	Название правового документа	Отраслевое Министерство /ведомство, ответственное за реализацию и контроль за исполнением
	Закон РТ «Об охране окружающей среды» 2011 (2017)	Комитет защиты окружающей среды РТ
	Водный кодекс РТ 2000 (2012)	Агентство мелиорации и ирригации при Правительстве РТ
	Закон РТ «Об экологическом мониторинге» 2011 (2014)	Комитет защиты окружающей среды РТ
	Закон РТ «Об экологическом образовании населения» 2010	Комитет защиты окружающей среды РТ
	Закон РТ «О государственной экологической экспертизе» 2012	Комитет защиты окружающей среды РТ
	Закон РТ «Об экологической экспертизе» 2012	Комитет защиты окружающей среды РТ
	Закон РТ «Об адресной социальной помощи» 2017	МЗСЗН РТ
	Закон РТ «Об обращениях физических и юридических лиц» 2016	Все государственные и негосударственные органы
	Закон РТ «Об общественных объединениях» 2007 (2019)	Министерство юстиции РТ
	Закон РТ «О местных органах государственной власти»	Местные органы государственной власти
	Кодекс общественного здравоохранения 2017	МЗСЗН РТ
	Закон РТ «Об отходах производства и потребления» 2002 (2011)	ГУП «Хочагии манзилию коммунали»
Постановление № 800 касательно загрязнения почвы и атмосферы выбросами	Комитет защиты окружающей среды РТ	

Перечень международных соглашений и конвенций, ратифицированных Таджикистаном.

Таблица 2

Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением (2016)
Конвенция о биологическом разнообразии (1997 г.) и ее Картахенский протокол по биобезопасности (2004)
Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия (1992)
Конвенция об охране нематериального культурного наследия (2006)
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
Конвенция об инспекции труда (2009)
Конвенция ООН о правах ребенка (1993)

Экологические и социальные стандарты ВБ:

Таблица 3

СЭС 1 - Оценка и предупреждение экологических и социальных рисков и последствий;
СЭС 2 - Труд и условия труда;
СЭС 3 - Ресурсы и эффективность, предотвращение и управление загрязнением; и
СЭС 4 - Здоровье и безопасность сообщества.
СЭС 10 – Доступ к информации и взаимодействие с заинтересованными сторонами.
Руководящие принципы ГВБ по охране окружающей среды и технике безопасности (ГБОС) (Общие руководящие принципы ГБОС: (a) ГБОС 2.5 – Биологические опасности; (b) ГБОС 2.7 – Средства индивидуальной защиты (СИЗ); (c) ГБОС 3.5 – Перевозка опасных материалов; и, (d) ГБОС 3.6 – Профилактика заболеваний;

Перечень строительных норм и правил Республики Таджикистан

Таблица 4

СНиП РТ 11-01-2005 «Состав и порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»
СНиП РТ 11-04-2020 «Типовое проектирование»
СНиП РТ 81-01-2010 «Республиканские единичные расценки на строительные работы»
СНиП РТ 81-01-2007 «Озеленение. Защитные лесонасаждения»
СНиП РТ 12-06-2020 «Технический надзор в строительстве»
СНиП РТ 03.01.04-01 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»

Публичные консультации

<p>Уточнить, когда/где проводятся общественные консультации</p>	<p>Общественные консультации проведены 27 апреля 2021 года со стороны региональных специалистов НСИФТ в городе Хороге с участием сотрудников типографии и сообщества в здании Хукумата района Ишкашим, который находится напротив здания ТГЗ.</p> <p>В Общественных консультациях участвовали 18 человек и относительно Плана управления окружающей и социальной средой (ПУОСС) для подпроекта SERSP-1С-16 со стороны участников предложения и комментарии не поступили.</p> <p>Контакты для поступления предложений и жалоб</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Телефон доверия центрального офиса НСИФТ в г. Душанбе: + 992-2-21-87-53 (звонок можно осуществлять круглосуточно, разговор будет записываться); 2) Электронная почта НСИФТ: info_sersp@nsift.tj. 3) Главный специалист по экологическим и социальным мерам безопасности в представительстве НСИФТ в городе Хороге Назарбекова Рохила: + 992-93-173-17-43
---	---

Развитие институционального потенциала

<p>Ожидается ли развитие потенциала?</p>	<p>Посредством НСИФТ будет организована программа обучения для развития и расширения профессиональных навыков и потенциала по вопросам управления охраной окружающей среды и социальным вопросам. Это обучение укрепит потенциал НСИФТ и КООС (Комитета по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан) на районном уровне путем предоставления специализированных инструкций по проведению экологических оценок, а также по управлению и мониторингу вопросов, связанных с защитными мерами. В рамках программы будет также оказана поддержка в деле проведения информационно-разъяснительной работы и консультаций с местными властями и бенефициарами подпроектов в целевых территориях для поощрения принципа «местной собственности». В рамках реализации подпроекта для развития институционального потенциала молодёжи предусмотрены обучающие мероприятия, тренинги по вопросам поиска источников средств к существованию. В рамках данной деятельности будет предусматриваться проведение адресной информационно-просветительской работы и подготовки в учебных лагерях (т.е. базовой краткосрочной подготовки) для более 500 уязвимых молодых мужчин и женщин, а также оказание специализированных услуг по поддержке</p>
--	--

жизнедеятельности (т.е. обучение предпринимательскому мышлению, анализу местного рынка, основам бухгалтерского учета, поддержка в подготовке бизнес-планов, последующее наставничество и обучение методам включения деятельности по смягчению последствий изменения климата в деятельности по обеспечению средств к существованию). НСИФТ будет нести ответственность за проведение данного тренинга; Перспективной молодежи будут предоставлены инструменты и оборудование в натуральной форме для облегчения ее доступа к небольшому капиталу в натуральном виде.

ЧАСТЬ В: ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И СОЦИАЛЬНЫХ АСПЕКТАХ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ/СОЦИАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ			
Деятельность/вопрос		Статус	Иницилируемые действия
А	Ремонтно-восстановительные работы или капитальный ремонт зданий	Да	Подрядчику необходимо следовать действиям, предусмотренным в Разделе А ниже
	Строительство новых небольших объектов	Нет	Новое строительство не планируется
В	Индивидуальная система отвода сточных вод с объекта	Да	Отвод сточных вод в ТГЗ централизованный
С	Исторические здания и районы	Нет	Исторические здания отсутствуют
Д	Отвод земельных участков ¹	Нет	Отвод земель не планируется, ремонтные работы будут проведены в пределах территории ТГЗ
Е	Опасные или токсичные материалы	Да	Подрядчику необходимо следовать мерам, описанным в Разделе Е ниже
Ф	Безопасность движения транспорта и пешеходов	Да	Ремонтные работы будут проводиться в пределах территории ТГЗ, что не повлияет на безопасность движения транспорта и пешеходов.
Г	Управление социальными рисками	Да	Подрядчику необходимо следовать Разделу Г ниже

ЧАСТЬ С: МЕРЫ ПО СМЯГЧЕНИЮ РИСКОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	ПАРАМЕТР	КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ПО СМЯГЧЕНИЮ РИСКОВ	ОТВЕТСТВЕННЫЕ СТОРОНЫ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕР
0. Общие условия	Информирование и безопасность работников на объекте	Разработать информационные плакаты или стенды о предстоящих работах	Подрядная организация
		Уведомлять общественность о проведении работ посредством размещения надлежащих оповещений в СМИ и (или) размещения объявлений в местах общего доступа (в том числе, на участке работ)	НСИФТ
		Перед началом работ подрядчик должен получить все требуемые законодательством разрешения на выполнение ремонтных работ	Подрядная организация Технадзор
		Перед началом работ предоставить возможность Подрядчику ознакомиться с требованиями по соблюдению дисциплины и техники безопасности при проведении ремонтных работ. Получить от Подрядчика официальное подтверждение о соблюдении требований техники безопасности и дисциплины при проведении ремонтных работ	НСИФТ Технадзор
		Перед началом работ уведомить Подрядчика о недопущении негативных мер воздействия или, при невозможности полного недопущения, сведения к	НСИФТ

		минимуму негативного воздействия на местных жителей и природную среду	
		Обеспечить соответствие индивидуальных средств защиты рабочим нормам передовой международной практики (постоянное использование защитных касок и, по необходимости, защитных масок, защитных очков, страховочных ремней безопасности и защитной обуви)	Подрядная организация
		Разместить на объекте (строительной площадке) соответствующие указатели, информирующие рабочих об основных правилах и нормах, которые следует соблюдать	Подрядная организация
		Для работы на объекте сотрудники Подрядчика должны пройти медосмотр и представить справки о состоянии здоровья	Подрядная организация
		Необходимо обеспечить ежедневный замер температуры тела рабочих и при выявлении у рабочего повышенной температуры направить в поликлинику для уточнения диагноза. Запретить больным рабочим допуск к месту проведения ремонтных работ	Подрядная организация
		Проведение инструктажа рабочих о технике безопасности при проведении работ	Подрядная организация

		Подписание кодекса поведения работников подрядных организаций	Подрядная организация
		Создать системы управления дорожным движением и провести обучение персонала – особенно для доступа на участок работ и интенсивного автомобильного движения возле него. Обеспечить безопасные проходы и переходы для пешеходов там, где этому мешает движение транспорта	Подрядная организация
		Отрегулировать рабочее время в соответствии с местным характером дорожного движения – например, избегать основной транспортной деятельности в часы пик или во время движения скота	Подрядная организация
А. Общие ремонтно-восстановительные и/или строительные работы	Качество воздуха	В летний период в райцентре Ишкашима умеренная температура, осадки очень редки в это время года, поэтому наблюдается естественное низкое повышения запыления атмосферного воздуха. Однако стоит отметить, что чрезмерное образование органической и неорганической пыли при проведении ремонтных работ может негативно сказаться на качестве атмосферного воздуха и здоровье населения. РМ ₁₀ – взвешенные частицы представляют собой вдыхаемые с воздухом частицы загрязняющих веществ диаметром менее 10 микрометров. Частицы размером более 2,5 микрометров могут оседать в дыхательных путях, что может привести к проблемам со здоровьем.	Подрядная организация

		<p>Таким образом, для смягчения отрицательного влияния на качество атмосферного воздуха, необходимо предпринять следующие действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> -запрещается сбрасывать строительные отходы через оконные проемы; -сжигать строительные отходы и другой мусор; - готовить еду на открытом огне; -подметать территорию и внутренние помещения Типографии газеты Зиндаги (ТГЗ) с предварительным увлажнением поверхностей; -накрывать инертные материалы при длительном их хранении во избежание запыления; -накрывать кузов автомобилей при транспортировке инертных материалов и строительных отходов для предотвращения сдувания пыли; -при бурении/сносе стен необходимо предпринимать меры по гидроподавлению пыли (поливанием водой); -необходимо устанавливать на участке проведения работы пылеулавливающие экраны, связанные с интенсивным образованием пыли; -строительные отходы должны храниться на отведенной для этих целей площадке; -при установлении жаркой и сухой погоды необходимо производить увлажнение строительных отходов в месте их временного хранения для предотвращения пылеобразования; -не допускать попадание почвы и строительного мусора на окружающие территории (тротуары, 	
--	--	---	--

		<p>дороги, арыки), чтобы минимизировать распространение пыли и загрязнений.</p> <p>-не допускать сжигание на участке работ сухостоя, опавших листьев.</p>	
	Шум	<p>Учитывая, что ремонтно-восстановительные работы ТГЗ для создания Центра обучения молодежи (ЦОМ) расположены на отдельной территории, а также в период реализации подпроекта, ТГЗ временно не будет функционировать, повышенный шум при проведении ремонтных работ не может причинить неудобства сотрудникам и посетителям ТГЗ, а также жителям прилегающих домохозяйств.</p> <p>При этом, ожидается что интенсивный, но непродолжительный шум будет возникать при разгрузке инертных материалов, необходимых для ремонта (щебень, песок), досок и металла, а также погрузки строительных отходов. В этой связи необходимо проводить вышеперечисленные работы в дневное время после 9 часов утра и до 19 часов вечера.</p> <p>Строго запрещается выбрасывать строительные отходы из оконных проемов для предотвращения возникновения шума и загрязнения прилегающей территории и атмосферного воздуха.</p> <p>Перед началом работ утвердить график работ с руководством ТГЗ, если он отличается от времени работы в промежутке от 9.00 до 19.00 часов.</p> <p>Электропитание оборудования, освещения и других электроинструментов будет происходить из общих</p>	<p>Подрядная организация</p> <p>Строй инспекция</p>

		<p>городских сетей электроснабжения. В этой связи использоваться электрогенераторы не будут. Однако при необходимости использования подобного оборудования необходимо согласовать время его эксплуатации с руководством ТГЗ.</p>	
	<p>Качество воды</p>	<p>Со всех сторон территории ТГЗ находятся зеленые полосы, для полива которых организована арычная система (лотки для отвода дождевых вод), а также система водоснабжения посёлка. Система арычного полива заполняется водой только в сезон дождей. Таким образом, чтобы исключить засорение и поломку арыков, рекомендуется размещение площадки для временного хранения строительных отходов обустроить на расстоянии 0,5 метров от арыка. Необходимо предусмотреть, чтобы при подъезде грузового автотранспорта не были поломаны арыки. Тем не менее, при попадании строительных отходов в арычную сеть необходимо предпринимать их удаление на площадку временного хранения отходов.</p> <p>Во время ремонтных работ запрещается мойка автомашин и строительного оборудования на территории ТГЗ. Чистка автомашин и оборудования должна производиться только на автомойках.</p> <p>Запрещается на территории ТГЗ заправка ГСМ, замена масел, фильтров и другие ремонтные работы автотехники для предотвращения загрязнения</p>	<p>Подрядная организация Стройинспекция</p>

		<p>поверхностных и подземных вод. Такие мероприятия должны производиться на станциях технического обслуживания. В случае непреднамеренной утечки ГСМ предпринять меры по их удалению. Если пролив ГСМ был произведен на оборудованные поверхности (асфальт, бетон), то необходимо использовать абсорбенты (песок, опилки, ветошь) для сбора пролива. Загрязненные абсорбенты необходимо собрать и хранить в специальной емкости до их утилизации. При проливе ГСМ на почву необходимо до их полного просачивания лопатами вынуть загрязненный грунт и поместить его в емкость. Хранить до их утилизации.</p> <p>Также запрещается сбрасывать строительные отходы из оконных проемов первого этажа и выше для предотвращения разноса легких элементов и фракций строительных отходов и как следствие загрязнения почв.</p>	
	Управление отходами	<p>Площадку временного хранения неопасных строительных отходов необходимо организовать с южной стороны ТГЗ для удобства и безопасности погрузки строительных отходов и вывоза их за территорию, так как дорога в ТГЗ находится с севера.</p> <p>Выбор места и площадь временного хранения неопасных строительных отходов необходимо</p>	<p>Подрядная организация Стройинспекция НСИФТ</p>

		<p>согласовать с руководством и специалистом по АХЧ (административно-хозяйственной части) ТГЗ.</p> <p>Перед началом ремонтных работ заключить договор на вывоз и утилизацию неопасных строительных отходов. Предоставить копию заключенного договора специалисту по экологическим и социальным мерам безопасности НСИФТ.</p> <p>При демонтаже деревянных конструкций их необходимо складывать отдельно от остальных отходов для их дальнейшей переработки или использования.</p> <p>Железные элементы конструкций необходимо сортировать и складывать отдельно от других видов отходов для их дальнейшей переработки или использования. Старую проводку из алюминия и меди необходимо сортировать и собирать отдельно от остальных отходов для их дальнейшей переработки.</p> <p>Бумажные и картонные отходы необходимо собирать отдельно от остальных видов отходов в защищенном от атмосферных осадков месте для сохранения их потребительских свойств и передачи на переработку.</p> <p>При демонтаже окон необходимо соблюдать технику безопасности и исключить любую возможность разбития стекла. Деревянные окна с</p>	
--	--	--	--

		<p>остеклением необходимо складировать отдельно в полной сохранности деревянной конструкции для их дальнейшего использования. В случае, если стекло было разбито, то крупные его осколки необходимо собрать в отдельную емкость с соблюдением осторожности, мелкие фрагменты стекла необходимо собрать метлой и с помощью совка удалить в ту же емкость с крупными фрагментами. Для предотвращения порезов и увечий от битого стекла необходимо их удалять с места проведения ремонтных работ в общие контейнеры для твердых бытовых отходов (ТБО).</p> <p>Люминесцентные лампы будут аккуратно демонтированы и переданы специалисту по АХЧ (административно-хозяйственной части) ТГЗ, так как в процессе ремонта будут установлены новые энергосберегающие лампы.</p> <p>Остальные строительные отходы, которые не могут быть использованы повторно или переработаны, должны собираться на специально отведенной площадке. При этом крупногабаритные отходы должны быть поделены на части для удобства их хранения и погрузки в автотранспорт для транспортировки. Строительные отходы нельзя хаотично сваливать друг на друга, они должны аккуратно укладываться для снижения их объемов и экономии места для хранения. Строительные отходы</p>	
--	--	---	--

		<p>должны собираться и храниться только в пределах отведенной для этих целей площадки.</p> <p>Из-за отсутствия канализации нет рисков загрязнения окружающей среды при ремонте данного объекта.</p>	
В. Индивидуальная система отвода сточных вод с объекта	Качество воды	Сточные воды здания типографии газеты «Зиндаги» отводятся в централизованную посёлковую водосбросную систему	
С. Историческое (ие) здание(я)	Культурное наследие	Ремонтируемое здание не является «Культурным наследием»	
Д. Отвод земельных участков	План/схема приобретения земельного участка	<p>В рамках реализации подпроекта SERSP-1С-16 планируется проведение ремонтных работ в существующем здании который имеет сертификат на землепользование. Отвода новых земель не предусматривается</p> <p>Однако в процессе капитального ремонта может быть временное ограничение доступа к зданию для посетителей и персонала ТГЗ. Тем не менее, для смягчения прямых или косвенных ограничения доступа для посетителей и персонала ТГЗ к зданию необходимо предпринять следующие действия: -Установить предупреждающие знаки, барьеры и перегородки, чтобы рабочая площадка была хорошо видна.</p>	

		<p>-Обеспечить безопасные проходы и переходы для персонала ТГЗ и посетителей к зданию при необходимости .</p> <p>-Отрегулировать рабочее время в соответствии со временем посещения ТГЗ.</p> <p>-При возможности проводить ремонтно-восстановительные работы в период отпусков сотрудников ТГЗ.</p> <p>-Обеспечить безопасный и постоянный доступ к классным помещениям в здание, где проводится ремонт.</p>	
Е. Токсичные материалы	Обращение с асбестом	<p>В ТГЗ не имеется материалов, изготовленных из асбеста. Трубы питьевого водоснабжения изготовлены из металла. В рамках реализации подпроекта SERSP-1С-16 предусмотрено восстановление кровли, однако существующая кровля не имеет покрытия из азбестоцементных материалов.</p> <p>При этом необходимо знать, что асбест является опасным материалом, если вдохнуть волокна или частицы, он может вызвать рак легких и другие легочные заболевания.</p> <p>В случае обнаружения асбеста при ремонтных работах необходимо предпринять следующие действия:</p>	Подрядная организация НСИФТ

		<p>- Остановить все работы в радиусе 5 м от места АСМ, произвести эвакуацию всего персонала с территории данного участка;</p> <p>- Обозначить границу территории в радиусе 5 м столбчатым ограждением для безопасности сигнальной лентой и легко видимыми предупреждающими знаками, оповещающие о присутствии асбеста;</p> <p>- Оповестить руководство ТГЗ, а также специалистов по надзору над исполнением природоохранных мер, чтобы без промедления организовали инспектирование объекта;</p> <p>При сборе асбеста необходимо использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ) и увлажнить материал, чтобы не допускать образования пыли, надежно упаковать асбест в пластиковые мешки и поместить их в контейнеры для асбестовых отходов с наклеенным обозначением «содержится асбест» (чистые металлические бочки), обеспечить герметичность каждого контейнера;</p> <p>Весь персонал, должен провести индивидуальную санитарную обработку, ополоснуться, прежде чем покинуть объект, а место после ополаскивания должно быть убрано влажной ветошью, которая затем будет помещена в пластиковые мешки, как указано выше.</p>	
	Обращение с токсичными /	Токсичных/опасных материалов на территории ТГЗ не имеется.	Подрядная организация Стройинспекция

	<p>опасными отходами</p>	<p>При этом, если в результате работ обнаружатся токсичные/опасные материалы (поврежденные ртутные градусники, тонометры, люминесцентные лампы), то необходимо провести следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Уведомить руководство ТГЗ, специалиста по экологическим и социальным мерам безопасности НСИФТ и предупредить рабочих об опасности воздействия паров ртути на здоровье человека. - Аккуратно, не повреждая оболочку прибора переместить его в безопасное место, которое должно находиться в хорошо проветриваемом помещении. -Отметить место временного размещения ртутьсодержащих приборов предупреждающими знаками. -Временное хранение токсичных веществ должны быть организовано в герметичных контейнерах, на которых должна быть указана информация по обращению с такими веществами. -Вызвать территориальное подразделение МЧС. <p>При обнаружении неповрежденных ртутных градусников, тонометров, люминесцентных ламп необходимо уведомить и передать приборы администрации ТГЗ.</p> <p>Во время проведения работ запрещается использовать краски и растворители с токсичными компонентами.</p>	<p>НСИФТ</p>
--	--------------------------	--	--------------

<p>Ф. Безопасность дорожного движения и пешеходов</p>	<p>Прямые или косвенные опасности</p>	<p>Ремонтные работы будут проводиться в пределах территории ТГЗ, что не повлияет на безопасность движения транспорта и пешеходов.</p>	
<p>Г. Управление социальным риском</p>	<p>Управление связями с общественностью</p>	<p>Подрядчик назначает одного своего сотрудника в качестве контактного лица, которое отвечает за связь с местным населением, а также за получение обращений/жалоб от местного населения. Подрядчик обязан проводить консультации с местными сообществами для урегулирования конфликтных ситуаций между заинтересованными сторонами, в том числе между работниками и местным населением. Подрядчик будет информировать близлежащее население о графиках ремонтных работ. Обеспечить Механизм рассмотрения жалоб для заинтересованных сторон и довести информацию до них.</p> <p>Менеджер представительства НСИФТ в ГБАО Абдурозиков Рахим</p> <p>Тел.: +992 902102810 +992 400600600</p>	<p>Подрядная организация НСИФТ</p>
	<p>Управление трудовыми вопросами</p>	<p><u>Трудовые отношения</u>; Привлекаемые рабочие рассматриваются как рабочая сила подрядчика и в связи с этим должны соблюдаться следующие требования: -Детский труд (детей до 18 лет) для выполнения любых видов работ на объекте полностью запрещён;</p>	<p>Подрядная организация НСИФТ</p>

		<p>-Привлечение членов сообществ в качестве общественных работ в рамках хашаров запрещено;</p> <p>-Подрядчик подписывает с каждым рабочим договор, в котором будут прописаны их права и обязанности с соблюдением трудовых норм, то есть</p> <ul style="list-style-type: none"> • 8 часовой рабочий день, в случае превышения установленного времени, учет внеурочного времени с соответствующей оплатой; • 40 часовая рабочая неделя; • 1 час на обед. <p>-Подрядчик подписывает с каждым рабочим кодекс поведения, соответствующий международной практике, и должен строго следовать ему, вплоть до увольнения рабочих и взимания соразмерных финансовых штрафов:</p> <p>-Повышать осведомленность рабочих об общих принципах управления связями с местным населением:</p> <p>-Организовать доступ рабочих к туалетам и зонам для мытья рук, которые должны быть обеспечены горячей и холодной водой, мылом и сушилкой для рук в достаточном объеме.</p> <p>- Разработать систему рассмотрения жалоб от рабочих.</p> <p><u>Условия проживания</u>; С учетом того, что плановые работы носят краткосрочный характер, то неквалифицированных рабочих по возможности необходимо привлекать из местных сообществ, а для</p>	
--	--	--	--

		<p>выполнения нетяжелой работы привлекать женщин. Если к выполнению работ будут привлекаться местные рабочие, то отпадает необходимость в предоставлении рабочим мест временного проживания, а обеспечение их адекватными условиями (кухней, душевыми, туалетом и т.д.) необходимо.</p> <p>Если к выполнению работ будут привлекаться рабочие из других регионов или городов и сел, не имеющие в месте проведения ремонтных работ своего жилья, то Подрядная организация должна обеспечить их жильем. Жилье должно быть обеспечено следующими условиями:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Спальными комнатами с кроватями; • Кухней с возможностью готовить еду, хранить продукты; • Санитарными условиями (душ или баня, туалет, место, где можно стирать одежду); • В холодное время года – отоплением; • Центральным электроснабжением. 	
	<p>Требования к охране здоровья и безопасности работников</p>	<p><u>Охрана здоровья:</u></p> <p>-На строительной площадке необходимо иметь медицинскую аптечку для оказания первой помощи для лиц, получивших производственную травму.</p> <p>-Ежедневно измерять температуру работников перед началом работ на строительной площадке.</p> <p>-Проведение регулярных мероприятий со всеми работниками на строительной площадке</p>	<p>Подрядчик</p>

		<p>относительно соблюдения требований по предотвращению COVID-19;</p> <p><u>Безопасность работников;</u></p> <p>-Проводить инструктаж по технике безопасности перед началом каждого вида работ и регулярно проверять соблюдение техники безопасности.</p> <p>-Обеспечить спецодеждой (маски, перчатки и защитные очки, для ремонтных работ также каски и защитная обувь), средствами индивидуальной защиты, инструментами, материалами;</p> <p>- Обеспечить необходимым оборудованием для выполнения высотных работ (строительные леса, временные ограждения, страховочные ремни и канаты и т.д.)</p>	
--	--	---	--

ЧАСТЬ D: ПЛАН МОНИТОРИНГА

Тип деятельности	Что за параметр подлежит мониторингу?	Где будет проводиться мониторинг параметра?	Каким образом будет проводиться мониторинг параметра?	Когда (Определите частоту / или непрерывность?)	Зачем (проводится мониторинг данного параметра?)	Кто (несёт ответственность за мониторинг?)
ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА						
Поставка строительных материалов	Закупка строительных материалов у лицензированного поставщика	В офисе или на складе поставщика	Верификация документов	При заключении договоров поставки	Обеспечить технический порядок объекта и его безопасность для охраны здоровья человека.	НСИФТ - Специалист по закупкам; НСИФТ - Специалист по охране окружающей среды; НСИФТ - Специалист по техническому надзору;

<p>Перевозка строительных материалов и отходов</p> <p>Передвижение строительной техники</p>	<p>Техническое состояние транспортных средств и оборудования;</p> <p>- Защита грузовых автомобилей при помощи чехла;</p> <p>- Соблюдение установленных часов и маршрутов перевозки</p>	<p>- Строительная площадка;</p> <p>- Маршруты транспортировки строительных материалов и отходов</p>	<p>Автомобили будут направлены на станцию технического осмотра</p>	<p>1 раз до начала работ</p>	<p>Для предотвращения утечек ГСМ, загрязнения атм. воздуха повышенной концентрации загрязняющих веществ в отходящих газах, уменьшения пыления при перевозке отходов с кузова и грунтовых дорог, снижения риска автомобильных аварий, снижения количества шума</p>	<p>НСИФТ - Специалист по охране окружающей среды;</p> <p>НСИФТ - Специалист по техническому надзору;</p>
<p>Движение строительной техники</p>	<p>Выбор маршрута доставки материалов и вывоза отходов</p> <p>Соблюдение установленных часов и маршрутов перевозки</p>	<p>На маршруте</p>	<p>Обследование маршрута</p>	<p>На постоянной основе</p> <p>Внезапные проверки в рабочее и нерабочее время</p>	<p>Для снижения воздействия шума на местное население, снижения интенсивности пыления при перевозке отходов с кузова и грунтовых дорог, выбора наикратчайшей дороги до места назначения, снижение риска автомобильных аварий.</p>	<p>НСИФТ - Специалист по охране окружающей среды;</p> <p>НСИФТ - Специалист по техническому надзору;</p>
<p>Техническое обслуживание строительной техники</p>	<p>Мойка автомобилей и строительной техники на специальных автомойках</p> <p>Ремонт автомобилей и строительной техники на СТО</p> <p>Заправка или смазка строительного оборудования на пунктах замены масла технического осмотра</p>	<p>Строительная площадка</p>	<p>Инспекция деятельности</p>	<p>Во время эксплуатации автотехники и оборудования</p>	<p>Избегать загрязнения воды и почвы нефтепродуктами при мойке и замене/доливке ГСМ</p> <p>Своевременно локализовать и уменьшить ожидаемый ущерб в случае пожара</p>	<p>НСИФТ - Специалист по охране окружающей среды;</p> <p>НСИФТ - Специалист по техническому надзору;</p> <p>НСИФТ - Специалист по мониторингу и оценке проекта.</p>

					Снижение шума при ремонте техники	
Образование строительных отходов	<p>Временное хранение строительных отходов в специально отведенных местах.</p> <p>Сортировка и отдельное хранение опасных отходов от неопасных</p>	Строительная площадка	<p>Инспекция деятельности. Подрядчик должен обеспечить, чтобы специалист СЭП проводил регулярные тренинги с рабочими по надлежащему разделению отходов, в частности по обращению с опасными строительными отходами; и вести регистрационные журналы для управления отходами</p>	Периодически во время строительства и после его завершения	<p>Предотвращать загрязнение почвы, поверхностных и подземных вод</p> <p>Сокращение объемов опасных отходов</p> <p>Увеличение объемов перерабатываемых отходов</p>	<p>ЦОМ -Администрация</p> <p>НСИФТ - Специалист по охране окружающей среды;</p> <p>НСИФТ - Специалист по техническому надзору;</p> <p>НСИФТ - Специалист по мониторингу и оценке проекта.</p>
	Своевременное удаление отходов в официально обозначенные места	Место утилизации отходов	Инспекция деятельности	Периодически во время строительства и после его завершения	<p>Избегать несчастных случаев на строительной площадке из-за разбро-санных фрагментов строительных материалов и мусора</p> <p>Сохранять эстетический вид строительной площадки и ее окрестностей</p> <p>Защита почвы, поверхностных вод, атмосфер-</p>	<p>ТГЗ -Администрация</p> <p>НСИФТ - Специалист по охране окружающей среды;</p> <p>НСИФТ - Специалист по техническому надзору;</p> <p>НСИФТ - Специалист по мониторингу и оценке проекта.</p>

					ного воздуха при временном хранении отходов	
Производство бытовых отходов	Размещение контейнеров для сбора отходов Договор на оказание услуг по вывозу и размещению бытовых отходов с муниципальным предприятием	Строительная площадка	Визуальное наблюдение	Общий срок ремонтных работ	Предотвратить загрязнение почвы и воды бытовыми отходами	ТГЗ -Администрация НСИФТ - Специалист по охране окружающей среды; НСИФТ - Специалист по техническому надзору. НСИФТ - Специалист по мониторингу и оценке проекта.
Реконструкция и благоустройство строительной площадки	Заключительная уборка территории	Строительная площадка	Инспекция деятельности	Период завершения строительства	Снизить потерю эстетической ценности ландшафта из-за строительных работ Защита окружающей среды	ТГЗ -Администрация НСИФТ - Специалист по охране окружающей среды; НСИФТ - Специалист по технадзору.
Здоровье и безопасность работников	Обеспечение строителей рабочей одеждой и СИЗ; Строгое соблюдение правил эксплуатации строительной техники и использования СИЗ; Строгое соблюдение национальных правил проведения строительных работ; Наличие основных средств пожаротушения; Наличие записей об инструктаже и обучении технике безопасн. труда	Строительная площадка	Инспекция деятельности. Специалист СЭП Подрядчика должен проводить регулярные тренировки по технике безопасности для рабочих и вести журналы учета таких тренингов с соответствующим и темами, применяемыми во время строительных работ.	Общий период работ	Уменьшить вероятность травм и несчастных случаев для строителей, снижение риска заражения COVID	ТГЗ -Администрация НСИФТ - Специалист по охране окружающей среды; НСИФТ - Специалист по техническому надзору; НСИФТ - Специалист по закупкам.

Трудовые отношения	Наличие письменных контрактов Не применение детского труда Отсутствие сексуального домогательства МРЖ для работников	Офис подрядчика Строительная площадка	Инспекция деятельности	Общий период работ	Предотвратить нарушения прав сотрудников	ТГЗ -Администрация НСИФТ - Специалист по охране окружающей среды; НСИФТ - Специалист по технадзору.
Связь с общественностью.	Наличие жалоб и предложений	В системе МОС	Через МОС	Общий период работ	Для приёма предложений, жалоб	НСИФТ - Специалист МОС;

ЭТАП ЭКСПЛУАТАЦИИ

Обращение с бытовыми отходами	Наличие подходящего типа и количества мусорных баков для бытовых отходов; Своевременный вывоз бытовых отходов с территории ТГЗ на основе договора об оказании услуг по вывозу и размещению отходов	Помещения ТГЗ	Осмотр помещений ТГЗ; Проверка наличия и действительности договора на вывоз и размещение отходов с муниципальным предприятием	Общий срок эксплуатации объекта	Поддержание хороших санитарных условий в ТГЗ; Ограничение загрязнения почвы, поверхностных и подземных вод	Администрация ТГЗ; Государственный Центр санитарного эпидемиологического надзора; НСИФТ - Специалист по охране окружающей среды; НСИФТ - Специалист по мониторингу и оценке проекта.
Готовность к чрезвычайным ситуациям	Наличие системы пожарной сигнализации и локализации пожара, а также аварийных резервных систем для электроснабжения и водоснабжения Наличие плана реагирования на ЧС	Помещения МУ	Периодические проверки. : В рамках Плана реагирования на ЧС ежемесячные проверки пожарной безопасности должны проводиться специалистом СЭП для обеспечения надлежащего оснащения пожарных станций и сохранения полностью	Общий срок эксплуатации объекта	Снизить риски для персонала и пациентов ТГЗ; Избегать сбоев в предоставлении коммунальных услуг в ТГЗ	Администрация ТГЗ, ответственный по ГО и ЧС; НСИФТ - Специалист по охране окружающей среды; НСИФТ - Специалист по мониторингу и оценке проекта.

			заряженных, хорошо смонтированных и работоспособных огнетушителей			
--	--	--	---	--	--	--

Составила:

Главный специалист по экологическим и социальным мерам безопасности НСИФТ в городе Хороге

Назарбекова Рохила

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ

«ЛОИҲАИ ТАҲКИМИ ПӨЙДОРИИ ИҶТИМОЙ-ИҚТИСОДӢ» «Socio-Economic Resilience Strengthening Project» ПРОТОКОЛ

Аз баргузории семинар – машварат оид ба муҳокимаи ҳуҷҷати нақшаи идоракунии чораҳои экологӣ ва иҷтимоӣ дар доираи “Лоихаи таҳкими устувории иҷтимоӣ иқтисодӣ”.

Вилояти Мухтори
Кухистони Бадахшон (ВМКБ)
ноҳияи Ишкошим,
ҷамоати деҳоти Р.Юсуфбеков
Сана баргузорӣ:

27 апрели соли 2021

Мақсад: Шиносоӣ кардани ҷомеа ва ҷонибҳои ҳавасманд бо тадбирҳои экологӣ ва иҷтимоии бехатарӣ дар доираи “Лоихаи таҳкими устувории иҷтимоӣ- иқтисодӣ”, зерлоихаи SERSP-1C-16, “Таъмири асосии бинои матбааи рӯзномаи “Зиндагӣ” барои бунёди маркази омӯзиши ҷавонон дар деҳаи Ишкошим, ҷамоати деҳоти Р.Юсуфбеков, ноҳияи Ишкошим”.

Ҷой ва санаи баргузорӣ: Мақомоти ноҳияи
Ишкошим, соати 11-00

Иштирок намуданд: Рӯйхати иштирокчиён (ниг. Замимаи 1).

Фасалитаторон: намояндагони дафтари марказии Бунёди миллии иҷтимоии маблағгузории Тоҷикистон (БМИМТ) дар шаҳри Хоруғ: Абдурозиқов Р - менечери Намояндагии БМИМТ дар шаҳри Хоруғ, Курбонбеков П сармутахассис муҳандис оиди назорати техникаи лоихаҳо БМИМТ дар шаҳри Хоруғ, Назарбекова Р сармутахассис оид ба чораҳои бехатарӣ- иҷтимоӣ БМИМТ дар шаҳри Хоруғ.

Рӯзномаи семинар- машварат:

1. Маълумоти умумӣ дар бораи “Лоихаи таҳкими устувории иҷтимоӣ- иқтисодӣ” (ЛГУИИ).
2. Муаррифии зерлоихаи SERSP-1C-16, “Таъмири асосии бинои матбааи рӯзномаи “Зиндагӣ” барои бунёди маркази омӯзиши ҷавонон дар деҳаи Ишкошим, ҷамоати деҳоти Р.Юсуфбеков, ноҳияи Ишкошим”.

3. Муҳокимаи хуччати нақшаи идоракунии чораҳои экологӣ-иҷтимоӣ дар зерлоихаи SERSP-1C-16, “Таъмири асосии бинои матбааи рӯзномаи “Зиндагӣ” барои бунёди маркази омӯзиши ҷавонон дар деҳаи Ишкошим, ҷамоати деҳоти Р.Юсуфбеков, ноҳияи Ишкошим”.
4. Таҳлили музокираҳо ва ҷамъбасти натиҷаҳои семинар – машварат.

Семинар машваратро муовини аввали раиси ноҳияи Ишкошим Неккадамзода Илол ифтихор намуда, мақсади доир намудани машварат – семинаро баён карда, иштирокчиён ро муаррифӣ намуд.

Менечери Намояндагии БМИМТ дар шаҳри Хоруғ Абдурозиков Раҳим мақсаду мӯхтавои “Лоихаи таҳкими иҷтимоӣ- иқтисодӣ”, ки бо дастгирии Бонки умумҷаҳонӣ амалӣ карда мешавад, ба иштирокчиён гуфта дод. Инчунин иброз намуд, ки лоихаи мазкур аз се қисм иборат буда, дар ҳалли мушкилотҳои афзалиятноки деҳаҳо, дар арзёбӣ ва баҳодии онҳо сахми ҷомеаи шаҳрвандӣ аввалиндараҷа мебошад. Рушд бо ташаббуси ҷомеаи шаҳрвандӣ яке аз шартҳои асосии татбиқи лоиха ба шумор рафта, масъулияти раисонидани ҷамоатҳои деҳот, раисони кумитаҳои деҳаҳо, МХҶ-ҳо барои ҷалби аҳоли ва сахмгузориҳои онҳоро дар ҳалли мушкилотҳои деҳа баланд мебардорад. Бо рушди маҳал, вазъи иҷтимоии аҳоли, бахусус ҷавонон бехтар мегардад.

Номбурда ҳозиринро ба Рӯзномаи семинар- машварат шинос намуда, қайд кард, ки мақсади асосии семинар- машварат аз шиносӣ бо хуччатҳои муҳими Лоиха:

1. Хуччати қолабии идоракунии чораҳои экологӣ-иҷтимоӣ. Оиди муаррифӣи “Хуччати қолабии идоракунии чораҳои экологӣ-иҷтимоӣ” сармутахассис оиди чораҳои беҳатарии экологӣ - иҷтимоии Намояндагии БМИМТ дар шаҳри Хоруғ Назарбекова Роҳила дар бораи риояи намудани талаботҳои санадҳои меъёрӣ ҳуқуқии амалкунандаи Ҷумҳурии Тоҷикистон, дар бораи ҳифзи табиат, дар рафти амалишавии ЛТУИИ вобаста ба амалисозии зерлоихаи SERSP-1C-16, “Таъмири асосии бинои матбааи рӯзномаи “Зиндагӣ” барои бунёди маркази омӯзиши ҷавонон дар деҳаи Ишкошим, ҷамоати деҳоти Р.Юсуфбеков, ноҳияи Ишкошим”. пешбинишуда ба назар гирифта шаванд.

Қайд карда шуд, ки хуччати мазкур дар асоси талаботи Бонки Ҷаҳонӣ оид ба стандартҳои экологӣ-иҷтимоӣ, ки соли 2019 аз нав қабул шудааст, таҳия гардидааст. Ин сиёсатҳои экологӣ аз 10 номгӯй иборат буда, ҳар як сиёсат мақсад ва мароми алоҳидаи худро дорад. Иҷрои ин сиёсатҳо ҳангоми амалисозии зерлоихаҳо, ки аз тарафи Боки Ҷаҳонӣ, маблағгузорӣ мешаванд, барои Пудратчиён ва ё қарзгирандагон ҳатмӣ мебошад. Вобаста ба ин талабҳои хуччати нақшаи идоракунии чораҳои экологӣ ва иҷтимоӣ (НИЧЭИ) таҳия карда мешавад.

Татбики зерлоихаҳои дар доираи қисмати 1С пешбинишуда метавонанд, боиси таъсири экологӣ, марбут ба садо, чанг, ҳаво ва об, идоракунии партовҳои саҳт, таназзули гуногунии биологӣ, бехатарӣ ва саломатӣ ва ғайра шаванд.

Дар ин ҳуҷҷат роҳҳои пешгирӣ ва паст намудан аз ҳама гуна хавфҳои пешниҳод шудааст. Инчунин, дар ҳолати зарар دیدан аз татбики зерлоихаҳои роҳҳои пешниҳод ва баррасии арзку шикоятҳои нишон дода шудааст, ки ҳар як шахрванд метавонад мустакилона истифода намояд.

Дар ҷамъбасти семинар-машварат паҳлуҳои норавшани ҳуҷҷати нақшаи идоракунии ҷораҳои экологӣ ва иҷтимоӣ аз иштирокчиён пурсида шуд, ки ягон таклифи пешниҳодҳои барои ворид намудан дар ҳуҷҷати зикршуда надоранд. Аз тарафи ҳозирин ягон таклифи пешниҳод нагардид, аммо чунин саволҳои пешниҳод гаштанд.

- Оё дар доираи лоиҳа рушди соҳибқорӣ хурду миёна ба назар гирифта шудааст ё не?
- Мухлати таъмири бинои матбааи “Зиндагӣ” чанд моҳро дар бар мегирад?
- Дар озмун барои сохтмони биноҳои ширкатҳои маҳаллӣ бартарӣ доранд ё не?

Ба саволҳои иштирокчиёни семинар-машварат менечери намоёндагии БМИМТ дар шаҳри Хоруғ Раҳим Абдурозиков посух дод:

1. Дар доираи лоиҳа дар байни ҷавонон семинарҳои гузаронида мешаванд, ки ҷавонон баъди семинар омузишҳои метавонанд лоиҳаҳои хешро баҳри рушди иҷтимоӣ деҳаҳои пешниҳод намоянд.
2. Мухлати таъмири бино аз шартномаи басташудаи байни муассиса ва пудратчӣ вобаста аст.
3. Дар озмун барои сохтмони биноҳои зерлоиҳа, ширкатҳои маҳаллӣ низ иштирок карда метавонанд.

Дар охир намоёндагони БМИМТ ба ҳозираи барои иштироқашон изҳори миннатдорӣ баён карда, дар фаъолиятҳои комёбиҳои таманно намуданд.

Расмҳои ва рӯйхати иштирокчиён замима мегарданд.

Протоколро навишт

27.04.2021

Сармутахассис оиди ҷораҳои бехатарии

экологии иҷтимоӣ

Назарбекова Роҳила





«ЛОИҲАИ ТАҲКИМИ ПОЙДОРИИ ИҚТИМОЙ-ИҚТИСОДИ»
«Socio-Economic Resilience Strengthening Project»

Сценари машваратӣ

Дар мавзӯи: “Пешниҳоди ҳуҷҷати нақшаи идоракунии ҷораҳои экологӣ ва ҳифзи иқтимоӣ” барои зерлоиҳаи SERSP-1C-16 «Таъмири асосии бинои матбааи рӯномаи “Зиндагӣ” барои бунёди маркази омӯзиши ҷавонон дар деҳаи Ишкошим, ҷамоати деоти Р.Юсуфбеков, ноҳияи Ишкошим».

ноҳия Ишкошим
2021

Сана: 27.04. соли 2021

Ҷои баргузорӣ: Маҷлаоти ноҳияи Ишкошим.

Рӯйхати иштирокчиён

№	Ному насаб	Вазифа/ташкilot	Телефон	Имзо
1.	Юсупов Абдуллоҳ А.	Мутахассиси Б.Ҷ.М.	501871291	<i>[Signature]</i>
2.	Ҷафариёв Соҳибжон	Сармуҳаррир	501851882	<i>[Signature]</i>
3.	Ҷафаров Валер	Бухгоҳи забткун	50107-38-23	<i>[Signature]</i>
4.	Масудов Н.	К.Ф.К.А., Ишкошим	501554472	<i>[Signature]</i>
5.	Масудов А.	Мудири ҷамоати деоти	5018043399	<i>[Signature]</i>
6.	Матмуродов Аниса	Мутахассиси таърифи ИИМ	501010941	<i>[Signature]</i>
7.	Сабуров Саиди Қасим	Сармуҳаррири ҷамоати деоти	501-16-23-39	<i>[Signature]</i>
8.	Ҷафаров С.	Мутахассиси Б.Ҷ.М.	501001249	<i>[Signature]</i>
9.	Муборакқадимов Д.	Мутахассиси ИИМ	501029927	<i>[Signature]</i>
10.	Майрӯбов В.	Сармуҳаррир	9385799600	<i>[Signature]</i>
11.	Султонов В. Саид	Заминсози Ҷ.М.	501614280	<i>[Signature]</i>
12.	Ҷафаров Соҳибжон	Мутахассиси “Зиндагӣ”	501-40-99-51	<i>[Signature]</i>
13.	Ҷафаров Маҷид	Мудири ҷамоати “Зиндагӣ”	501060097	<i>[Signature]</i>
14.	Ҷафаров Сабир	Сармуҳаррир	501-41-56-88	<i>[Signature]</i>
15.	Ҷафаров Маҷид	Мудири ҷамоати	931134929	<i>[Signature]</i>
16.	Масудов Маҷид	Сармуҳаррир Ҷ.М.	504-44-10-15	<i>[Signature]</i>
17.	Масудов Маҷид	Мутахассиси Ҷ.М.	501315397	<i>[Signature]</i>
18.	Масудов Маҷид	Мутахассиси Ҷ.М.	933430033	<i>[Signature]</i>
19.				
20.				
21.				
22.				
23.				
24.				
25.				
26.				

Шахси масъул: Ҷафаров Соҳибжон Имзо: *[Signature]*
