

РЕСПУБЛИКА ТАДЖИКИСТАН



НАЦИОНАЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ФОНД ТАДЖИКИСТАНА

ПРОЕКТ ПОВЫШЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

«План управления окружающей и социальной средой»

*По подпроекту: SERSP-1C-01/1 «Строительства сливного туалета для
центра обучения молодежи в здании Центра обучения взрослых по улице 1-
Мая 12, города Куляба»*

Январь, 2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ.....	3
1. Введение.....	4
2. Цель подпроекта.....	6
ЧАСТЬ А: ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ И СТРОИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ	7
ЧАСТЬ В: ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И СОЦИАЛЬНЫХ АСПЕКТАХ.....	16
ЧАСТЬ С: МЕРЫ ПО СМЯГЧЕНИЮ РИСКОВ	17
ЧАСТЬ D: ПЛАН МОНИТОРИНГА.....	34
ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ	38

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ

АСМ	Асбестосодержащий материал [АСМ]
ВБ	Всемирный Банк
ВОЗ	Всемирная Организация Здравоохранения
ГБАО	Горно-бадахшанская автономная область
ГН	Гендерное Насилие
КООС	Комитет по охране окружающей среды [СЕР]
КДП	Комиссия джамоата по проекту [JPC]
ЛЗП	Люди, затронутые проектом
МОС	Механизм обратной связи
МЗСЗН	Министерство Здравоохранения и Социальной Защиты Населения Республики Таджикистан
МТМЗН	Министерство Труда, Миграции и Занятости Населения Республики Таджикистан
МОН	Министерство Образования и Науки Республики Таджикистан
НСИФТ	Национальный социальный инвестиционный фонд Таджикистан
ПВЗС	План Взаимодействия с Заинтересованными сторонами
ОПП	Основы политики переселения
ОВОСС	Оценка воздействия на окружающую и социальную сферу [ESIA]
ПГТ	Посёлок городского типа (городок)
ПРП	Партнер по реализации проекта [IP]
ПДП	План действий по переселению
ПТЛ	Профессионально-технический лицей
ППСЭУ	Проект повышения социально-экономической устойчивости
ПУОСС	План управления окружающей и социальной средой [ESMP]
РДОССВ	Рамочный документ охраны окружающей среды и социальным вопросам [ESMF]
СИЗ	Средства Индивидуальной Защиты
СЦЗ	Сельский центр здоровья
ТБО	Твёрдые бытовые отходы
НПО	Неправительственная организация
ЦДО	Центр дополнительного образования
ЦОВ	Центр обучения взрослых
ЦУП	Центр управления проектом
ЭКО	Экологическая и социальная оценка [ESA]
СЭС	Социально экологические стандарты
ГЭЭ	Государственная экологическая экспертиза

1. Введение

Цели развития Проекта повышения социально-экономической устойчивости (ППСЭУ) состоят в том, чтобы укрепить местное самоуправление на основе широкого участия, улучшить качество местной инфраструктуры в целевых сообществах и расширить возможности для внеклассного обучения или получения средств к существованию для молодежи. Проект состоит из трех взаимосвязанных компонентов.

Компонент 1 предусматривает субгранты для финансирования социально-экономической инфраструктуры на местном уровне, которые направлены на решение приоритетных задач, определенных в ходе оценки потребностей сельских районов и процесса принятия решений на основе широкого участия. В рамках данного компонента будет также наращиваться потенциал администраций джамоатов и общинных учреждений. Основное внимание уделяется поддержке мобилизации сообществ и молодежи в целевых районах, с целью их вовлечения в процесс принятия решений о субгрантах и их постоянному вовлечению в цикл каждого подпроекта.

Компонент 2 проекта предусматривает проведение мероприятий в интересах нетрудоустроенных юношей и девушек с низким уровнем социально-экономического благополучия в целях повышения их общей устойчивости к таким рискам, как социальное отчуждение, бездеятельность и разочарованность. Данный компонент будет финансировать оказание инклюзивных услуг для молодежи и реабилитацию молодежных и общественных помещений, а также проведение тренингов по вопросам обеспечения источников средств к существованию, и приобретения инструментов и оборудования для осуществления мероприятий по обеспечению источников средств к существованию в семи целевых районах ГБАО и Хатлонской области.

В рамках компонента 3 будут финансироваться управление проектом, мониторинг и оценка, и наращивание потенциала.

Данный проект будет способствовать достижению более высоких целей в рамках Программы «Режима снижения рисков» (РСР) Всемирного банка, связанных с повышением устойчивости, которая определяется в качестве способности человека, сообщества и/или страны приспосабливаться к трудностям, неблагоприятным воздействиям и/или внешним потрясениям, либо реагировать на них, а также устранять их, что в свою очередь позволит уменьшить степень уязвимости перед такими вызовами и предотвращать дальнейшие риски возникновения неустойчивости.

Потенциальные экологические воздействия.

Предполагаемая деятельность по проекту в рамках Компонентов 1 и 2 может привести к экологическим последствиям, связанным с шумом, пылью, загрязнением воздуха и воды, управлением твердыми отходами, деградацией биоразнообразия, опасностями для здоровья и проблемами в сфере охраны труда

и т.д. Ожидается, что экологические риски будут типичными для небольших инфраструктурных подпроектов и восстановительных работ по созданию центров обучения молодежи. Проектные мероприятия будут временными по своей природе и ограничены площадью участков. Все последствия могут быть соответствующим образом смягчены посредством применения наилучших методов строительства и соответствующих смягчающих мер. Риск стихийных бедствий и климатических потрясений высокий, в связи с чем проект будет включать наращивание потенциала местных субъектов по ряду соответствующих вопросов, касающихся уязвимости, конфликтов и насилия, и управления рисками бедствий, с участием местных и общинных учреждений, а также официальных и неофициальных лидеров.

Потенциальные социальные воздействия и вопросы переселения.

Проект направлен на улучшение социально-экономической инклюзии целевых уязвимых групп населения, а также молодых мужчин и женщин. Компонент 1 будет способствовать улучшению доступа к транспорту/питьевому водоснабжению/электричеству/или ирригации в целевых сообществах, а также будет работать с махаллинскими комитетами или джамоатами для повышения их эффективности и оперативности реагирования на нужды членов сообществ. В рамках Компонента 2 проекта будет увеличено участие молодых мужчин и женщин в гражданской деятельности, обучении, индивидуальной трудовой деятельности или предпринимательской деятельности. Предполагаемая деятельность по проекту в рамках Компонентов 1 и 2 может привести к негативным социальным последствиям, связанным с временным ограничением доступа, приобретением земли, добровольной передаче земли, ожиданиями соседнего сообщества в отношении совместного использования выгод, неполным социальным охватом, неэффективностью социального посредничества в деле сокращения масштабов бедности, неэффективным управлением инвестициями в поддержку местных сообществ, рисками, связанными с управлением и борьбой с коррупцией, трудовыми рисками и связанные с этим насилие на основе гендерного различия, охраной здоровья и безопасности.

В целях предотвращения экологических и социальных рисков в рамках реализации “Проекта повышения социально-экономической устойчивости” НСИФТ разработал Рамочный документ охраны окружающей и социальной среды (РДООССВ) в соответствии с требованиями Всемирного банка и обнародовал его внутри страны во время общественных консультаций 13 марта 2019 года в городе Кулябе, 14 марта 2019 г. в Пянджском районе Хатлонской области; онлайн-консультации с заинтересованными сторонами в ГБАО были объявлены 10 апреля 2019 года. Окончательная версия РДООССВ была опубликована на сайте НСИФТ 15 апреля 2019 г. (www.nsift.tj). Версия РДООССВ была официально представлена для публикации на английском языке на внешнем веб-сайте ВБ в апреле 2019 года.

2. Цель подпроекта

Цель данного подпроекта заключается в том, чтобы укрепить местное самоуправление на основе широкого участия, улучшить качество местной инфраструктуры в целевых сообществах и расширить возможности для внеклассного обучения или получения средств к существованию молодежи в Кулябской зоне. Основная цель разработки Плана управления окружающей и социальной средой (ПУОСС) заключается в том, чтобы избежать, свести к минимуму или смягчить потенциальные негативные воздействия на окружающую среду и социальные последствия, вызванные в результате реализации подпроекта. Данный ПУОСС позволит обеспечить проведение надлежащей оценки разработанных подпроектов с экологической и социальной точек зрения и на предмет их соответствия утвержденным ВБ экологическим и социальным стандартам, а также законам и нормативно-правовым актам Республики Таджикистан в сфере охраны окружающей среды и социальных вопросов, с целью достаточного смягчения каких-либо остаточных и/или неизбежных воздействий. Кроме того, в нем содержатся рекомендации по проведению экологического и социального мониторинга и подготовке соответствующей отчетности. Цель этого контрольного перечня заключается в том, что он будет применяться в качестве руководящих принципов для подрядчиков малых работ и является неотъемлемой частью тендерной документации для подрядчиков, выполняющих небольшие строительные работы в рамках проектов, финансируемых Банком.

В рамках реализации компонента 1С запланировано создание 17 центров обучения молодежи, из них в 6 объектах предусмотрено новое строительство, в 9 объектах - проведение капитального ремонта и в 2 - мелкий ремонт в целевых районах ГБАО (Вандж, Шугнан и Ишкашим) и Хатлонской области (Хамадони, Фархор, Пяндж и г. Куляб).

В связи с этим, для каждого объекта по проведению капитальных ремонтов предусмотрено разработать План управления окружающей и социальной средой (ПУОСС).

ЧАСТЬ А: ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ И СТРОИТЕЛЬНОМ УЧАСТКЕ

1А. Институциональные и административные данные.			
Страна	Таджикистан		
Название Проекта	Проект повышения социально- экономической устойчивости (ППСЭУ) в Таджикистане		
Исполнитель Проекта	Национальный социальный инвестиционный фонд Таджикистана (НСИФТ)		
Охват проекта и проектной деятельности	ППСЭУ охватывает 7 районов двух областей: Хатлонской области и Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО) Республики Таджикистан и направлен на улучшение социально-экономической инфраструктуры районов и развитие современных навыков целевых уязвимых групп, в частности молодых женщин и мужчин, которые не охвачены обучением и трудовой деятельностью, граничащих с Исламской Республикой Афганистан.		
Сфера деятельности участка/объекта	Центр обучения взрослых (ЦОВ) по улице 1 мая №12 города Куляб, Хатлонская область. На базе ЦОВ создание Центра обучения для молодежи города Куляб.		
Институциональные механизмы (имя и контактные данные)	Всемирный банк: Руководитель проекта: Одри Сакс asacks@worldbank.org	НСИФТ: Координатор ППСЭУ: Рахматуллоев О. orazbuda1982@gmail.com	
Механизмы реализации (имя и контактные данные)	Надзор за экологическими и социальными рисками (НСИФТ) Главный специалист по экологическим и социальным мерам безопасности в представительстве НСИФТ в городе Кулябе Саъдии Хайдар: Эл.почта: saadi1991@bk.ru Моб.тел.: 992-985-26-00-21	Подрядчик: (подлежит к определению)	Государственный надзор
2А. Описание строительного участка			
Название участка (подпроект)	SERSP-1C-01/1 “Строительства сливного туалета для центра обучения молодежи в здании Центра обучения взрослых по улице 1-Мая 12, города Куляба”		
Описание местоположения объекта, включая	Адрес: Республика Таджикистан Хатлонская область, город Куляб, улица 1 мая №12. Центр обучения молодёжи (ЦОМ) Министерства труда, миграции и занятости населения Республики		

<p>приложение с картой объекта</p>	<p>Таджикистан находится в центре города Куляба (координаты его расположения $37^{\circ}54'51''N$ $69^{\circ}48'14''E$). Напротив ЦОВ через автодорогу с запада на расстоянии более 200 метров находится спортивный комплекс, со стороны юга на расстоянии около 150 метров находится строительный участок под заправочную станцию, со стороны северо-востока и юго-запада от границы ЦОВ на расстоянии от 200 до 300 метров находятся жилые дома.</p>  <p>Карта участка подпроекта SERSP-1С-01/1 (красная линия)</p>
<p>Кому принадлежит земля?</p>	<p>Земля в Республике Таджикистан является исключительно собственностью государства, и государство гарантирует эффективное её использование в интересах народа.</p>
<p>Кто использует землю (формально / неформально)?</p>	<p>Использует землю центр обучения взрослых Министерства труда, миграции и занятости населения Республики Таджикистан, который имеет сертификат землепользователя на 2,4 га, выданный со стороны государственного органа по управлению землей Республики Таджикистан 12 сентября 2011 года №906, степень А №0292588.</p>
<p>Описание вопросов географического, физического, биологического, геологического, гидрографического и социально-экономического характера</p>	<p><u>Географическое описание:</u> Центр обучения взрослых расположен в центре города Куляба в 184 км к юго-востоку от города Душанбе и 165 км к юго-западу от города Бохтар столицы Хатлонской области. В городе Кулябе по данным 2021 года проживают 103600 человек, что в совокупности составляет 19134 хозяйства. Климат города Куляба является аналогичным климату программных районов - Хамадони и Фархора Хатлонской области, является континентальным и не входит в самые жаркие районы Хатлонской области.</p>

Таблица 1. Основные характеристики климата в восточной части Хатлонской области (Кулябская зона, в которую входит город Куляб)

Температура окружающей среды (на открытом воздухе)	Минимум:	-25°С и более
	Максимум:	+45°С и более
	Среднее дневное значение:	+35°С и более в июле
	Среднегодовое значение:	+16-17° С
Относительная влажность	январь - 80%, июль - 40%, очень засушливо	
Среднее количество осадков:	От 100-200 мм и от 400 до 800 мм.	
Количество дней с дождевым туманом:	Около 100 дней	
Максимальная солнечная радиация:	От 2,800 до 3,000 часов и более	
Максимальная температура почвы:	Более 36° С	
Приземная температура	От 32°С до 36°С и может быть больше (июль)	
Высота (метров над уровнем моря):	До 1000 метров	
Скорость ветра:	До 2,1 м/сек.	
Сейсмичность района	9 баллов	

В городе Кулябе зима достаточно мягкая, при этом температура воздуха падает до -25°С и ниже. Нормативная снеговая нагрузка составляет 70 кг/м². Общее среднегодовое количество осадков в городе Кулябе составляет 468,4 мм, он в наибольшей степени подвержен риску стихийных бедствий, таких как землетрясения, которые также могут вызвать оползни, сели и наводнения. Особенно в весенний период наблюдаются паводки из-за повышения уровня воды в речке Яхсу и Тебалай происходит затопление прилегающих домов и земель сельской и городской местности города Куляба. В связи с этим ежегодно проводятся берегоукрепительные мероприятия со стороны МЧС и Хукумата района.

Физическое описание: В 1974 году по решению Совета министров Республики Таджикистан в городе Кулябе было открыто Профессионально-техническое училище (ПТУ), которое и по настоящее время состоит из трёх двухэтажных учебных корпусов, расположенных на территории 2,4 гектаров в центре города.

В конце 90-х годов прошлого века данное училище (ПТУ) было переименовано на Профессионально-технический лицей (ПТЛ).



Фото профессионально-технического лицея (ПТЛ)

В 2008 году по решению Правительства Республики Таджикистан с целью развития уровня образованности взрослых среди безработных и трудовых мигрантов на базе первого учебного корпуса ПТЛ был создан Центр обучения взрослых (ЦОВ)

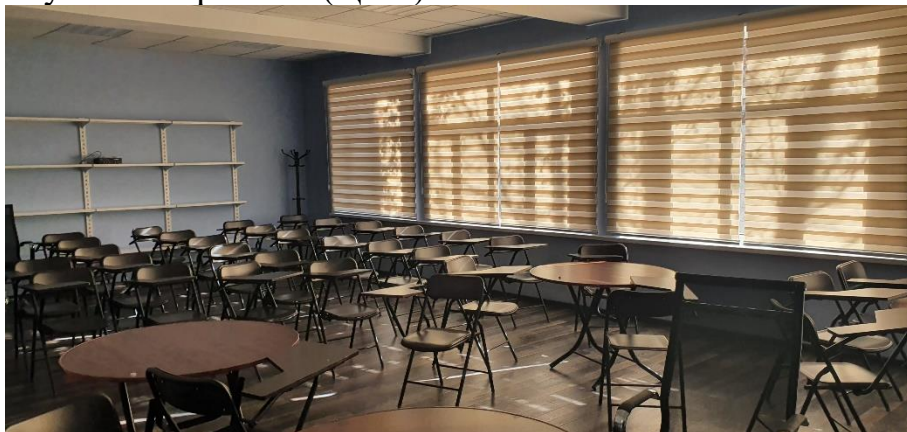


Фото: Центра обучения молодежи (ЦОМ)

По инициативе Всемирного банка после завершения реализации подпроекта SERSP-1С-01 “Капитальный ремонт 3 классных помещений для создания центра обучения молодежи в здании Центра обучения взрослых по улице 1-Мая 12 города Куляба” рекомендовано построить сливной туалет на одно очко для учеников, которые будут заниматься в центре обучения для молодёжи.



Фото Центра обучения молодежи (ЦОМ)

Планируется построить сливной туалет на втором этаже здания Центра обучения взрослых (ЦОВ). В рамках реализации подпроекта SERSP-1C-01/1 предусмотрен капитальный ремонт небольшого помещений с общей площадью 16 м². Запланированные мероприятия будет производиться на основе дефектного акта и разработанных чертежей со стороны инженеров НСИФТ, внутри помещения будут проводиться ремонтные работы по замене окна и двери, потолков и полов, системы внутреннего электроснабжения, отделочные работы внутренних стен и пола с устройством керамических плит. Также работы по устройству внутренних и наружных инженерных сетей по водоснабжению и канализации. Продолжительность строительно-восстановительных работ по подпроекту SERSP-1C-01/1 составит 3 месяца и гарантийный срок после ввода объекта в эксплуатацию 1 (один) год.

Биологическое описание: Биологическая среда района с удивительным многообразием фауны и флоры находятся за пределами зоны проектного воздействия.

Геологическое описание: Геология характеризуется сложенными кайнозойскими и преимущественно миоценовыми осадочными породами, состоящими из толстых блоков проксимальных оплетенных речных отложений, отражающих крупные речные равнины. Почвы в основном состоят из отложений, эродированных с гор и состоящих из чередующихся слоёв гравия, песка, ила и глин.

Гидрографическое описание: По центру Куляба проходит речка Тебалай и по окраине города проходит река Яхсу. Основным источником этих речек являются ледниковые, снеговые и дождевые воды.

Однако, изменение климата показало, что из-за уменьшения объёма ледников в горах восточные притоки реки Яхсу стали сохнуть в летние месяцы на 1-2 месяца дольше, чем десять лет тому назад. Сокращения объёма воды в руслах рек из-за потепления климата в будущем может привести к дефициту орошаемых вод в регионе в вегетационный период.

Неглубокое залегание грунтовых вод обусловлено естественным выклиниванием, слабой дренированностью данных участков и фильтрацией воды из оросительной сети. Основной причиной подъема уровня грунтовых вод является выход из строя

	<p>или засыпка существовавшей ранее дренажной системы, как на застроенной территории, так и за ее пределами.</p> <p><u>Социально-экономическое описание:</u> Город Куляб является вторым городом по величине после города Бохтара в Хатлонской области и граничит на севере с районом Ховалинг, на востоке с районом Муминабад, на юге с районом Ш.Шохин и на западе с районом Восе.</p> <p>Население города Куляб по информации на 2021 год составляет 103600 человек (19134 хозяйств), также в состав города входит три сельских джамоата, включающих 53 села, в которых проживают 115700 человек (14247 хозяйств). Общее количество населения города Куляба с учётом сельских джамоатов составляет более 219300 тысячи людей, из них 53% проживают в сельской местности. Из общего количества населения, более 20% составляют молодые люди в возрасте от 15 до 30 лет. Основная часть населения занята в сельском хозяйстве и трудовой миграции.</p> <p>Источником дохода населения города является трудовая миграция, работа в государственных учреждениях, малый бизнес, в сельских джамоатах - земледелие, животноводство, садоводство.</p>										
<p>Месторасположение и расстояние от пункта материального снабжения, особенно, агрегатов, воды, камней?</p>	<p>Строительные материалы: цемент, жженый кирпич, пило/материалы, оконные, дверные проёмы, все отделочные материалы, а также необходимые материалы будут доставлены из города Душанбе на расстояние 190 км. Инертные материалы (песок, щебень) на объект будут поставляться поблизости от действующего карьера района Хамадони</p>										
Законодательство											
<p>Уточнить национальное и местное законодательство и разрешения, которые применяются к проектной деятельности</p>	<p style="text-align: center;"><i>Перечень национальных законов и нормативов</i></p> <p style="text-align: right;"><i>Таблица 1</i></p> <table border="1" data-bbox="603 1559 1540 2038"> <thead> <tr> <th data-bbox="603 1559 1090 1709">Название правового документа</th> <th data-bbox="1090 1559 1540 1709">Отраслевое Министерство /ведомство, ответственное за реализацию и контроль за исполнением</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="603 1709 1090 1783">Закон РТ «Об охране окружающей среды» 2011 (2017)</td> <td data-bbox="1090 1709 1540 1783">Комитет защиты окружающей среды РТ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 1783 1090 1895">Водный кодекс РТ 2000 (2012)</td> <td data-bbox="1090 1783 1540 1895">Агентство мелиорации и ирригации при Правительстве РТ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 1895 1090 1968">Закон РТ «Об экологическом мониторинге» 2011 (2014)</td> <td data-bbox="1090 1895 1540 1968">Комитет защиты окружающей среды РТ</td> </tr> <tr> <td data-bbox="603 1968 1090 2038">Закон РТ «Об экологическом образовании населения» 2010</td> <td data-bbox="1090 1968 1540 2038">Комитет защиты окружающей среды РТ</td> </tr> </tbody> </table>	Название правового документа	Отраслевое Министерство /ведомство, ответственное за реализацию и контроль за исполнением	Закон РТ «Об охране окружающей среды» 2011 (2017)	Комитет защиты окружающей среды РТ	Водный кодекс РТ 2000 (2012)	Агентство мелиорации и ирригации при Правительстве РТ	Закон РТ «Об экологическом мониторинге» 2011 (2014)	Комитет защиты окружающей среды РТ	Закон РТ «Об экологическом образовании населения» 2010	Комитет защиты окружающей среды РТ
Название правового документа	Отраслевое Министерство /ведомство, ответственное за реализацию и контроль за исполнением										
Закон РТ «Об охране окружающей среды» 2011 (2017)	Комитет защиты окружающей среды РТ										
Водный кодекс РТ 2000 (2012)	Агентство мелиорации и ирригации при Правительстве РТ										
Закон РТ «Об экологическом мониторинге» 2011 (2014)	Комитет защиты окружающей среды РТ										
Закон РТ «Об экологическом образовании населения» 2010	Комитет защиты окружающей среды РТ										

Закон РТ «О государственной экологической экспертизе» 2012	Комитет защиты окружающей среды РТ
Закон РТ «Об экологической экспертизе» 2012	Комитет защиты окружающей среды РТ
Закон РТ «Об адресной социальной помощи» 2017	МЗСЗН РТ
Закон РТ «Об обращениях физических и юридических лиц» 2016	Все государственные и негосударственные органы
Закон РТ «Об общественных объединениях» 2007 (2019)	Министерство юстиции РТ
Закон РТ «О местных органах государственной власти»	Местные органы государственной власти
Кодекс общественного здравоохранения 2017	МЗСЗН РТ
Закон РТ «Об отходах производства и потребления» 2002 (2011)	ГУП «Хочагии манзилию коммунали»
Постановление № 800 касательно загрязнения почвы и атмосферы выбросами	Комитет защиты окружающей среды РТ

Перечень международных соглашений и конвенций, ратифицированных Таджикистаном

Таблица 2

Базельская конвенция о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их удалением (2016)
Конвенция о биологическом разнообразии (1997 г.) и ее Картахенский протокол по биобезопасности (2004)
Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия (1992)
Конвенция об охране нематериального культурного наследия (2006)
Международный пакт об экономических, социальных и культурных правах
Конвенция о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин
Конвенция об инспекции труда (2009)
Конвенция ООН о правах ребенка (1993)

Экологические и социальные стандарты ВБ:

Таблица 3

СЭС 1 - Оценка и предупреждение экологических и социальных рисков и последствий;
СЭС 2 - Труд и условия труда;
СЭС 3 - Ресурсы и эффективность, предотвращение и управление загрязнением; и
СЭС 4 - Здоровье и безопасность сообщества.
СЭС 10 – Доступ к информации и взаимодействие с заинтересованными сторонами.
Руководящие принципы ГВБ по охране окружающей среды и технике безопасности (ГБОС) (Общие руководящие принципы ГБОС: (а) ГБОС 2.5 – Биологические опасности; (б) ГБОС 2.7 – Средства индивидуальной защиты (СИЗ); (с) ГБОС 3.5 – Перевозка опасных материалов; и,

	(d) ГБОС 3.6 – Профилактика заболеваний; Перечень строительных норм и правил Республики Таджикистан <i>Таблица 4</i>
	СНиП РТ 11-01-2005 «Состав и порядок разработки, согласования и утверждения проектной документации на строительство предприятий, зданий и сооружений»
	СНиП РТ 11-04-2020 «Типовое проектирования»
	СНиП РТ 81-01-2010 «Республиканские единичные расценки на строительные работы»
	СНиП РТ 81-01-2007 «Озеленение. Защитные лесонасаждения»
	СНиП РТ 12-06-2020 «Технический надзор в строительстве»
	СНиП РТ 03.01.04-01 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения»
	СанПиН 983-72 «Санитарные правила устройства и содержания общественных уборных»

Публичные консультации

Уточнить, когда/где проводятся общественные консультации

Общественные консультации (ОК) проведены 10 января 2022 года со стороны НСИФТ с участием сотрудников центра обучения взрослых (ЦОВ) и жителей близ расположенных домов на втором этаже здания ЦОВ по улице 1 мая №12 города Куляб, в которой участвовали 23 человека.

Во время проведения ОК относительно Плана управления окружающей и социальной средой (ПУОСС) для подпроекта SERSP-1С-01/1 со стороны сотрудников ЦОВ поступили вопросы относительно шума и пыли в период проведения ремонтных работ, и на эти вопросы отвечали специалисты НСИФТ.

Контакты для поступления предложений и жалоб

- 1) Телефон доверия центрального офиса НСИФТ в г. Душанбе: +992-2-21-87-53, (звонок можно осуществлять круглосуточно, разговор будет записываться);
- 2) Электронная почта НСИФТ: info_sersp@nsift.tj.
- 3) Главный специалист по экологическим и социальным мерам безопасности в представительстве НСИФТ в городе Кулябе Саъдии Хайдар: + 992-985-26-00-21

Развитие институционального потенциала

Ожидается ли развитие потенциала?

Посредством НСИФТ будет организована программа обучения для развития и расширения профессиональных навыков и потенциала по вопросам управления охраной окружающей среды и социальным вопросам. Это обучение укрепит потенциал НСИФТ и КООС (Комитета по охране окружающей среды при Правительстве Республики Таджикистан) на районном уровне

путем предоставления специализированных инструкций по проведению экологических оценок, а также по управлению и мониторингу вопросов, связанных с защитными мерами. В рамках программы будет также оказана поддержка в деле проведения информационно-разъяснительной работы и консультаций с местными властями и бенефициарами подпроектов в целевых территориях для поощрения принципа «местной собственности». В рамках реализации подпроекта для развития институционального потенциала молодёжи предусмотрены обучающие мероприятия, тренинги по вопросам поиска источников средств к существованию. В рамках данной деятельности будет предусматриваться проведение адресной информационно-просветительской работы и подготовки в учебных лагерях (т.е. базовой краткосрочной подготовки) для более 1000 уязвимых молодых мужчин и женщин, а также оказание специализированных услуг по поддержке жизнедеятельности (т.е. обучение предпринимательскому мышлению, анализу местного рынка, основам бухгалтерского учета, поддержка в подготовке бизнес-планов, последующее наставничество и обучение методам включения деятельности по смягчению последствий изменения климата в деятельности по обеспечению средств к существованию). НСИФТ будет нести ответственность за проведение данного тренинга; Перспективной молодежи будут предоставлены инструменты и оборудование в натуральной форме для облегчения ее доступа к небольшому капиталу в натуральном виде.

ЧАСТЬ В: ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И СОЦИАЛЬНЫХ АСПЕКТАХ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ/СОЦИАЛЬНЫЙ СКРИНИНГ			
Деятельность/вопрос		Статус	Иницилируемые действия
А	Ремонтно-восстановительные работы или капитальный ремонт зданий	Да	Подрядчику необходимо следовать действиям, предусмотренным в Разделе А ниже
	Строительство новых небольших объектов	Нет	Новое строительство не планируется
В	Индивидуальная система отвода сточных вод с объекта	Нет	Отвод сточных вод в профессионально-техническом лицее централизованный
С	Исторические здания и районы	Нет	Исторические здания отсутствуют
Д	Отвод земельных участков ¹	Нет	Отвод земель не планируется, ремонтные работы будут проведены в пределах территории профессионально-технического лицея
Е	Опасные или токсичные материалы	Да	Подрядчику необходимо следовать мерам, описанным в Разделе Е ниже
Ф	Безопасность движения транспорта и пешеходов	Нет	Ремонтные работы будут проводиться в пределах территории профессионально-технического лицея, что не повлияет на безопасность движения транспорта и пешеходов.
Г	Управление социальными рисками	Да	Подрядчику необходимо следовать Разделу Г ниже

ЧАСТЬ С: МЕРЫ ПО СМЯГЧЕНИЮ РИСКОВ

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	ПАРАМЕТР	КОНТРОЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ПО СМЯГЧЕНИЮ РИСКОВ	ОТВЕТСТВЕННЫЕ СТОРОНЫ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ МЕР
0. Общие условия	Информирование и безопасность работников на объекте	Разработать информационные плакаты или стенды о предстоящих работах	Подрядная организация
		Уведомлять общественность о проведении работ посредством размещения надлежащих оповещений в СМИ и (или) размещения объявлений в местах общего доступа (в том числе, на участке работ)	НСИФТ
		Перед началом работ подрядчик должен получить все требуемые законодательством разрешения на выполнение ремонтных работ	Подрядная организация Технадзор
		Перед началом работ предоставить возможность Подрядчику ознакомиться с требованиями по соблюдению дисциплины и техники безопасности при проведении ремонтных работ. Получить от Подрядчика официальное подтверждение о соблюдении требований техники безопасности и дисциплины при проведении ремонтных работ	НСИФТ Технадзор
		Перед началом работ уведомить Подрядчика о недопущении негативных мер воздействия или при невозможности полного недопущения, то сведения к минимуму негативного воздействия на местных жителей и природную среду	НСИФТ

		Обеспечить соответствие индивидуальных средств защиты рабочим нормам передовой международной практики (постоянное использование защитных касок и, по необходимости, защитных масок, защитных очков, страховочных ремней безопасности и защитной обуви)	Подрядная организация
		Разместить на объекте (строительной площадке) соответствующие указатели, информирующие рабочих об основных правилах и нормах, которые следует соблюдать	Подрядная организация
		Для работы на объекте сотрудники Подрядчика должны пройти медосмотр и представить справки о состоянии здоровья	Подрядная организация
		Необходимо обеспечить ежедневный замер температуры тела рабочих и при выявлении у рабочего повышенной температуры направить в поликлинику для уточнения диагноза. Запретить больным рабочим допуск к месту проведения ремонтных работ	Подрядная организация
		Проведение инструктажа рабочих о технике безопасности при проведении работ	Подрядная организация
		Подписание кодекса поведения работников подрядных организаций	Подрядная организация
		Создать системы управления дорожным движением и провести обучение персонала – особенно для доступа на участок работ и интенсивного	Подрядная организация

		автомобильного движения возле него. Обеспечить безопасные проходы и переходы для пешеходов там, где этому мешает движение транспорта	
		Отрегулировать рабочее время в соответствии с местным характером дорожного движения – например, избегать основной транспортной деятельности в часы пик или во время движения скота	Подрядная организация
А. Общие ремонтно-восстановительные и/или строительные работы	Качество воздуха	<p>Летний период в городе Кулябе длительный и жаркий, осадки в этот период бывают редкими, поэтому наблюдается естественное повышенное запыление атмосферного воздуха. Учитывая, что ремонтно-восстановительные работы будут проводиться на втором этаже здания Центра обучения взрослых (ЦОВ) для создания Центра обучения молодежи (ЦОМ), который находится на крайней части здания (с правой стороны коридора), чрезмерное образование органической и неорганической пыли при проведении ремонтных работ может негативно сказаться на качестве атмосферного воздуха и здоровье сотрудников ЦОВ. Таким образом, для смягчения отрицательного влияния на качество атмосферного воздуха, необходимо предпринять следующие действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> -запрещается сбрасывать строительные отходы через оконные проемы; -сжигать строительные отходы и другой мусор; - готовить еду на открытом огне; 	Подрядная организация

		<ul style="list-style-type: none">-подметать территорию и внутренние помещения ЦОВ с предварительным увлажнением поверхностей;-накрывать инертные материалы при длительном их хранении во избежание запыления;-накрывать кузовов автомобилей при транспортировке инертных материалов и строительных отходов для предотвращения сдувания пыли;-при бурении/сносе стен необходимо предпринимать меры по гидроподавлению пыли (поливанием водой);-необходимо устанавливать пылеулавливающие экраны на участке проведения работ, связанных с интенсивным образованием пыли;-строительные отходы должны храниться на отведенной для этих целей площадке;-при установлении жаркой и сухой погоде необходимо производить увлажнение строительных отходов в месте их временного хранения для предотвращения пылеобразования;-не допускать попадание почвы и строительного мусора на окружающие территории (тротуары, дороги, арыки), чтобы минимизировать распространение пыли и загрязнений.-не допускать сжигание на участке работ сухостоя, опавших листьев.	
--	--	---	--

	Шум	<p>Учитывая, что ремонтно-восстановительные работы для создания Центра обучения молодежи (ЦОМ), будут проводиться на втором этаже здания Центра обучения взрослых (ЦОВ), а также жилые дома (спальный район) расположены на расстоянии не менее 200 м от границы ЦОВ находятся жилые дома. В этой связи повышенный шум при проведении ремонтных работ может причинить неудобства сотрудникам и учащимся ЦОВ, а также незначительно жителям прилегающих домохозяйств.</p> <p>В связи с тем, что ремонтные работы затрагивают только внутренние помещения Центра образования взрослых (ЦОВ), значительного шума от работ происходить не станет.</p> <p>При этом, ожидается что интенсивный, но непродолжительный шум будет возникать при разгрузке инертных материалов, необходимых для ремонта (щебень, песок), досок и металла, а также погрузки строительных отходов. В этой связи необходимо проводить вышеперечисленные работы в дневное время после 9 часов утра и до 19 часов вечера.</p> <p>Строго запрещается выбрасывать строительные отходы из оконных проемов для предотвращения возникновения шума и загрязнения прилегающей территории и атмосферного воздуха.</p>	<p>Подрядная организация Стройинспекция</p>
--	-----	--	---

		<p>Перед началом работ утвердить график работ с руководством Центра образования взрослых (ЦОВ), если он отличается от времени работы в промежутке с 9.00 до 19.00 часов. Электропитание оборудования, освещения и других электроинструментов будет происходить из общих городских сетей электроснабжения. В этой связи электрогенераторы использоваться не будут. Однако при необходимости использования подобного оборудования необходимо согласовать время его эксплуатации с руководством ЦОВ.</p>	
	<p>Качество воды</p>	<p>Со всех сторон территории ПТЛ находятся зеленые полосы, для полива которых организована арычная система (лотки для отвода дождевых вод). Система арычного полива заполняется водой только в сезон дождей. Таким образом, чтобы исключить засорение и поломку арыков, рекомендуется размещение площадки для временного хранения строительных отходов обустроить на расстоянии 0,5 метров от арыка. Необходимо предусмотреть, чтобы при подъезде грузового автотранспорта не были поломаны арыки. Тем не менее, при попадании строительных отходов в арычную сеть необходимо предпринимать их удаление на площадку временного хранения отходов.</p> <p>Во время ремонтных работ запрещается мойка автомашин и строительного оборудования на территории ЦОВ. Чистка автомашин и</p>	<p>Подрядная организация Стройинспекция</p>

		<p>оборудования должна производиться только на автомойках.</p> <p>Запрещается на территории ЦОВ заправка ГСМ, замена масел, фильтров и другие ремонтные работы автотехники для предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод. Такие мероприятия должны производиться на станциях технического обслуживания. В случае непреднамеренной утечки ГСМ предпринять меры по их удалению. Если пролив ГСМ был произведен на оборудованные поверхности (асфальт, бетон), то необходимо использовать абсорбенты (песок, опилки, ветошь) для сбора пролива. Загрязненные абсорбенты необходимо собрать и хранить в специальной емкости до их утилизации. При проливе ГСМ на почву необходимо до их полного просачивания лопатами вынуть загрязненный грунт и поместить его в емкость. Хранить до их утилизации.</p> <p>Также запрещается сбрасывать строительные отходы из оконных проемов первого этажа и выше для предотвращения разноса легких элементов и фракций строительных отходов и как следствия загрязнения почв.</p>	
	Управление отходами	Площадку временного хранения неопасных строительных отходов необходимо организовать с западной стороны Центра образования взрослых (ЦОВ) для удобства и безопасности погрузки	Подрядная организация Строй инспекция НСИФТ

		<p>строительных отходов и вывоза их за территорию, так как главные ворота в ЦОВ находятся с запада.</p> <p>Выбор места и площадь временного хранения неопасных строительных отходов необходимо согласовать с руководством и специалистом по АХЧ (административно-хозяйственной части) ЦОВ.</p> <p>Перед началом ремонтных работ заключить договор на вывоз и утилизацию неопасных строительных отходов. Предоставить копию заключенного договора специалисту по экологическим и социальным мерам безопасности НСИФТ.</p> <p>При демонтаже деревянных конструкций их необходимо складывать отдельно от остальных отходов для их дальнейшей переработки или использования.</p> <p>Железные элементы конструкций необходимо сортировать и складывать отдельно от других видов отходов для их дальнейшей переработки или использования. Старую проводку из алюминия и меди необходимо сортировать и собирать отдельно от остальных отходов для их дальнейшей переработки.</p> <p>Бумажные и картонные отходы необходимо собирать отдельно от остальных видов отходов в защищенном от атмосферных осадков месте для сохранения их потребительских свойств и передачи на переработку.</p>	
--	--	---	--

		<p>При демонтаже окон необходимо соблюдать технику безопасности и исключить любую возможность разбития стекла. Деревянные окна с остеклением необходимо складировать отдельно в полной сохранности деревянной конструкции для их дальнейшего использования. В случае, если стекло было разбито, то крупные его осколки необходимо собрать в отдельную емкость с соблюдением осторожности, мелкие фрагменты стекла необходимо собрать метлой и с помощью совка удалить в ту же емкость с крупными фрагментами. Для предотвращения порезов и увечий от битого стекла необходимо их удалять с места проведения ремонтных работ в общие контейнеры для твердых бытовых отходов (ТБО).</p> <p>Люминесцентные лампы будут аккуратно демонтированы и переданы специалисту по АХЧ (административно-хозяйственной части) ЦОВ, так как в процессе ремонта будут установлены новые энергосберегающие лампы.</p> <p>Остальные строительные отходы, которые не могут быть использованы повторно или переработаны должны собираться на специально отведенной площадке. При этом крупногабаритные отходы должны быть поделены на части для удобства их хранения и погрузки в автотранспорт для транспортировки. Строительные отходы нельзя хаотично сваливать друг на друга, они должны</p>	
--	--	--	--

		<p>аккуратно укладываться для снижения их объемов и экономии места для хранения. Строительные отходы должны собираться и храниться только в пределах отведенной для этих целей площадки.</p> <p>Исключать во время ремонта образование опасных жидких строительных отходов, которые при попадании в систему канализации могут привести к ее засору, поломке, химическому изменению бытовых сточных вод, которые приведут к нарушению работы городских очистных сооружений.</p> <p>При этом неопасные строительные жидкие отходы необходимо удалять в систему городской канализации. При этом, надо иметь в виду, что остатки бетонных растворов, которые не были использованы нельзя сливать в городскую систему канализации. Их необходимо законсервировать и использовать позже, если невозможно, то надо дать им застыть и размещать вместе с другими неопасными твердыми строительными отходами.</p>	
В. Индивидуальная система отвода сточных вод с объекта	Качество воды	Сточные воды центра обучения взрослых (ЦОВ), в том числе и от Центра обучения молодежи (ЦОМ), отводятся в централизованную систему городской канализации согласно договору с коммунальными службами района Хамадони	
С. Историческое (ие) здание(я)	Культурное наследие	Ремонтируемое здание не является «Культурным наследием»	

<p>D. Отвод земельных участков</p>	<p>План/схема приобретения земельного участка</p>	<p>В рамках реализации подпроекта SERSP-1C-01 планируется проведение ремонтных работ в трёх классных помещениях существующего здания на территории ЦОВ, который имеет сертификат на землепользование. Отвода новых земель не предусматривается.</p> <p>Однако при строительно-восстановительных работах может быть временное ограничение доступа к зданию для учащихся и персонала ЦОВ.</p> <p>Тем не менее, для смягчения прямых или косвенных ограничений доступа для учащихся и персонала ЦОВ к зданию, необходимо предпринять следующие действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Установить предупреждающие знаки, барьеры и перегородки, чтобы рабочая площадка была хорошо видна. -Обеспечить безопасные проходы и переходы для учащихся и персонала ЦОВ к зданию при необходимости. -Отрегулировать рабочее время в соответствии со временем проведения занятий в ЦОВ. -При возможности проводить ремонтно-восстановительные работы в период каникул учащихся. -Обеспечить безопасный и постоянный доступ к классным помещениям в здании, где проводится ремонт. 	
------------------------------------	---	---	--

<p>Е. Токсичные материалы</p>	<p>Обращение с асбестом</p>	<p>В ЦОВ не имеется материалов, изготовленных из асбеста. Трубы питьевого водоснабжения изготовлены из металла. В рамках реализации подпроекта SERSP-1C-01 предусмотрено восстановление кровли, однако существующая кровля не имеет покрытия из асбестоцементных материалов.</p> <p>При этом необходимо знать, что асбест является опасным материалом, если вдохнуть волокна или частицы, он может вызвать рак легких и другие легочные заболевания.</p> <p>В случае обнаружения асбеста при ремонтных работах необходимо предпринять следующие действия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Остановить все работы в радиусе 5 м от места АСМ, произвести эвакуацию всего персонала с территории данного участка; - Обозначить границу территории в радиусе 5 м столбчатым ограждением для безопасности сигнальной лентой и легко видимыми предупреждающими знаками, оповещающими о присутствии асбеста; - Оповестить руководство ЦОВ, а также специалистов по надзору над исполнением природоохранных мер, чтобы без промедления организовали инспектирование объекта. 	<p>Подрядная организация НСИФТ</p>
-------------------------------	-----------------------------	--	--

		<p>При сборе асбеста необходимо использовать средства индивидуальной защиты (СИЗ) и увлажнить материал, чтобы не допускать образования пыли, надежно упаковать асбест в пластиковые мешки и поместить их в контейнеры для асбестовых отходов с наклеенным обозначением «содержится асбест» (чистые металлические бочки), обеспечить герметичность каждого контейнера;</p> <p>Весь персонал, должен провести индивидуальную санитарную обработку, ополоснуться, прежде чем покинуть объект, а место после ополаскивания должно быть убрано влажной ветошью, которая затем будет помещена в пластиковые мешки, как указано выше.</p>	
	<p>Обращение с токсичными / опасными отходами</p>	<p>Токсичных/опасных материалов на территории ЦОВ не имеется.</p> <p>При этом, если в результате работ обнаружатся токсичные/опасные материалы (поврежденные ртутные градусники, тонометры, люминесцентные лампы), то необходимо провести следующие мероприятия:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Уведомить руководство по ЦОВ, специалиста по экологическим и социальным мерам безопасности НСИФТ, предупредить рабочих об опасности воздействия паров ртути на здоровье человека. - Аккуратно, не повреждая оболочку прибора переместить его в безопасное место, которое должно находиться в хорошо проветриваемом помещении. 	<p>Подрядная организация Стройинспекция НСИФТ</p>

		<p>-Отметить место временного размещения ртутьсодержащих приборов предупреждающими знаками.</p> <p>-Временное хранение токсичных веществ должно быть организовано в герметичных контейнерах, на которых должна быть указана информация по обращению с такими веществами.</p> <p>-Вызвать территориальное подразделение МЧС.</p> <p>При обнаружении неповрежденных ртутных градусников, тонометров, люминесцентных ламп необходимо уведомить и передать приборы администрации ЦОВ.</p> <p>Во время проведения работ запрещается использовать краски и растворители с токсичными компонентами.</p>	
<p>Ф. Безопасность дорожного движения и пешеходов</p>	<p>Прямые или косвенные опасности</p>	<p>Ремонтные работы будут проводиться в пределах территории центра обучения взрослых, что не повлияет на безопасность движения транспорта и пешеходов.</p>	
<p>Г. Управление социальным риском</p>	<p>Управление связями с общественностью</p>	<p>Подрядчик назначает одного своего сотрудника в качестве контактного лица, которое отвечает за связь с местным населением, а также за получение обращений/жалоб от местного населения.</p> <p>Подрядчик обязан проводить консультации с местными сообществами для урегулирования конфликтных ситуаций между заинтересованными сторонами, в том числе между работниками и местным населением.</p>	<p>Подрядная организация НСИФТ</p>

		<p>Подрядчик будет информировать близлежащее население о графиках ремонтных работ.</p> <p>Обеспечить Механизм рассмотрения жалоб для заинтересованных сторон и довести информацию до них.</p> <p>Менеджер представительства НСИФТ в Кулябе: Одинаев Мирзомурод: Тел.: +992 918898198</p>	
	<p>Управление трудовыми вопросами</p>	<p><u>Трудовые отношения</u>; Привлекаемые рабочие рассматриваются как рабочая сила подрядчика и связи с этим должны соблюдаться следующее требования:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Детский труд (детей до 18 лет) для выполнения любых видов работ на объекте полностью запрещён; -Привлечение членов сообществ в качестве общественных работ в рамках хашаров запрещено; -Подрядчик подписывает с каждым рабочим договор, в котором будут прописаны их права и обязанности с соблюдением трудовой норм, то есть <ul style="list-style-type: none"> • 8 часовой рабочий день, в случае превышения установленного времени учет внеурочного времени с соответствующей оплатой; • 40 часовая рабочая неделя; • 1 час на обед; -Подрядчик подписывает с каждым рабочим кодекс поведения, соответствующий международной практике, и рабочие должны строго следовать ему, в противном случае возможно увольнение рабочих и взимание соразмерных финансовых штрафов; 	<p>Подрядная организация НСИФТ</p>

		<p>-Повышать осведомленность рабочих об общих принципах управления связями с местным населением;</p> <p>-Организовать доступ рабочих к туалетам и зонам для мытья рук, которые должны быть обеспечены горячей и холодной водой, мылом и сушилкой для рук в достаточном объеме.</p> <p>- Разработать систему рассмотрения жалоб от рабочих.</p> <p><u>Условия проживания</u>; С учетом того, что плановые работы носят краткосрочный характер, то неквалифицированных рабочих по возможности необходимо привлекать из местных сообществ, а для выполнения нетяжелой работы привлекать женщин. Если к выполнению работ будут привлекаться местные рабочие, то отпадает необходимость в предоставлении рабочим мест временного проживания, а обеспечения их адекватными условиями (кухней, душевыми, туалетом и т.д.) необходимо.</p> <p>Если к выполнению работ будут привлекаться рабочие из других регионов или городов и сел, не имеющие в месте проведения ремонтных работ своего жилья, то Подрядная организация должна обеспечить их жильем. Жилье должно быть обеспечено следующими условиями:</p> <ul style="list-style-type: none">• Спальными комнатами с кроватями;	
--	--	--	--

		<ul style="list-style-type: none"> • Кухней с возможностью готовить еду, хранить продукты; • Санитарными условиями (душ или баня, туалет, место, где можно стирать одежду); • В холодное время года – отоплением; • Центральным электроснабжением. 	
	Требования к охране здоровья и безопасности работников	<p><u>Охрана здоровья:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -На строительной площадке необходимо иметь медицинскую аптечку для оказания первой помощи для лиц, получивших производственную травму; -Ежедневно измерять температуру работников перед началом работ на строительной площадке; -Проводить регулярные мероприятия со всеми работниками на строительной площадке относительно соблюдения требований по предотвращению COVID-19. <p><u>Безопасность работников:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Проводить инструктаж по технике безопасности перед началом каждого вида работ и регулярно проверять соблюдения техники безопасности; -Обеспечить спецодеждой (маски, перчатки и защитные очки, для ремонтных работ также каски и защитная обувь), средствами индивидуальной защиты, инструментами, материалами; - Обеспечить необходимым оборудованием для выполнения высотных работ (строительные леса, временные ограждения, страховочные ремни и канаты и т.д.). 	Подрядчик

ЧАСТЬ D: ПЛАН МОНИТОРИНГА

Тип деятельности	Что за параметр подлежит мониторингу?	Где будет проводиться мониторинг параметра?	Каким образом будет проводиться мониторинг параметра?	Когда (Определите частоту / или непрерывность?)	Зачем (проводится мониторинг данного параметра?)	Кто (несёт ответственность за мониторинг?)
ЭТАП СТРОИТЕЛЬСТВА						
Поставка строительных материалов	Закупка строительных материалов у лицензированного поставщика	В офисе или на складе поставщика	Верификация документов	При заключении договоров поставки	Обеспечить технический порядок объекта и его безопасность для охраны здоровья человека.	НСИФТ - Специалист по закупкам; НСИФТ - Специалист по охране окружающей среды; НСИФТ - Специалист по техническому надзору;
Перевозка строительных материалов и отходов Передвижение строительной техники	Техническое состояние транспортных средств и оборудования; - Защита грузовых автомобилей при помощи чехла; - Соблюдение установленных часов и маршрутов перевозки	- Строительная площадка; - Маршруты транспортировки строительных материалов и отходов	Автомобили будут направлены на станцию технического осмотра	1 раз до начала работ	Для предотвращения утечек ГСМ, загрязнения атм. воздуха повышенной концентрации загрязняющих веществ в отходящих газах, уменьшения пыления при перевозке отходов с кузова и грунтовых дорог, снижения риска автомобильных аварий, снижения количества шума	НСИФТ - Специалист по охране окружающей среды; НСИФТ - Специалист по техническому надзору;
Движение строительной техники	Выбор маршрута доставки материалов и вывоза отходов Соблюдение установленных часов и маршрутов перевозки	На маршруте	Обследование маршрута	На постоянной основе Внезапные проверки в рабочее и нерабочее время	Для снижения воздействия шума на местное население, снижения интенсивности пыления при перевозке отходов с кузова и грунтовых дорог, выбора кратчайшей дороги до места назначения,	НСИФТ - Специалист по охране окружающей среды; НСИФТ - Специалист по техническому надзору;

					снижения риска автомобильных аварий.	
Техническое обслуживание строительной техники	Мойка автомобилей и строительной техники на специальных автомойках Ремонт автомобилей и строительной техники на СТО Заправка или смазка строительного оборудования на пунктах замены масла технического осмотра	Строительная площадка	Инспекция деятельности	Во время эксплуатации автотехники и оборудования	Избегать загрязнения воды и почвы нефтепродуктами при мойке и замене/доливке ГСМ Своевременно локализовать и уменьшить ожидаемый ущерб в случае пожара Снижение шума при ремонте техники	НСИФТ - Специалист по охране окружающей среды; НСИФТ - Специалист по техническому надзору; НСИФТ - Специалист по мониторингу и оценке проекта.
Образование строительных отходов	Временное хранение строительных отходов в специально отведенных местах. Сортировка и отдельное хранение опасных отходов от неопасных	Строительная площадка	Инспекция деятельности. Подрядчик должен обеспечить, чтобы специалист СЭП проводил регулярные тренинги с рабочими по надлежащему разделению отходов, в частности по обращению с опасными строительными отходами; и вести регистрационные журналы для управления отходами	Периодически во время строительства и после его завершения	Предотвращать загрязнение почвы, поверхностных и подземных вод Сокращение объемов опасных отходов Увеличение объемов перерабатываемых отходов	ЦОВ - Администрация НСИФТ - Специалист по охране окружающей среды; НСИФТ - Специалист по техническому надзору; НСИФТ - Специалист по мониторингу и оценке проекта.
	Своевременное удаление отходов в официально обозначенные места	Место утилизации отходов	Инспекция деятельности	Периодически во время строительства и после его завершения	Избегать несчастных случаев на строительной площадке из-за разбросанных фрагментов строительных материалов и мусора. Сохранять эстетический вид строительной площадки и ее окрестностей. Защита почвы, поверхностных	ЦОВ - Администрация НСИФТ - Специалист по охране окружающей среды; НСИФТ - Специалист по техническому надзору;

					вод, атмосферного воздуха при временном хранении отходов	НСИФТ - Специалист по мониторингу и оценке проекта.
Производство бытовых отходов	Размещение контейнеров для сбора отходов Договор на оказание услуг по вывозу и размещению бытовых отходов с муниципальным предприятием	Строительная площадка	Визуальное наблюдение	Общий срок ремонтных работ	Предотвратить загрязнение почвы и воды бытовыми отходами	ЦОВ -Администрация НСИФТ - Специалист по охране окружающей среды; НСИФТ - Специалист по техническому надзору. НСИФТ - Специалист по мониторингу и оценке проекта.
Реконструкция и благоустройство строительной площадки	Заключительная уборка территории	Строительная площадка	Инспекция деятельности	Период завершения строительства	Снизить потерю эстетической ценности ландшафта из-за строительных работ.Защита окружающей среды	ЦОВ -Администрация НСИФТ - Специалист по охране окружающей среды; НСИФТ - Специалист по технадзору.
Здоровье и безопасность работников	Обеспечение строителей рабочей одеждой и СИЗ; Строгое соблюдение правил эксплуатации строительной техники и использования СИЗ; Строгое соблюдение национальных правил проведения строительных работ; Наличие основных средств пожаротушения; Наличие записей об инструктаже и обучении технике безопасности труда	Строительная площадка	Инспекция деятельности. Специалист СЭП Подрядчика должен проводить регулярные тренинги по технике безопасности для рабочих и вести журналы учета таких тренингов с соответствующими темами, применяемыми во время строительных работ.	Общий период работ	Уменьшить вероятность травм и несчастных случаев для строителей, снижение риска заражения COVID	ЦОВ -Администрация НСИФТ - Специалист по охране окружающей среды; НСИФТ - Специалист по техническому надзору; НСИФТ - Специалист по закупкам.
Трудовые отношения	Наличие письменных контрактов Неприменение детского труда	Офис подрядчика Строительная площадка	Инспекция деятельности	Общий период работ	Предотвратить нарушения прав сотрудников	ЦОВ -Администрация НСИФТ - Специалист по охране окружающей среды;

	Отсутствие сексуального домогательства МРЖ для работников					НСИФТ - Специалист по технадзору.
Связь с общественностью.	Наличие жалоб и предложений	В системе МОС	Через МОС	Общий период работ	Для приёма предложений, жалоб	НСИФТ - Специалист МОС;
ЭТАП ЭКСПЛУАТАЦИИ						
Обращение с бытовыми отходами	Наличие подходящего типа и количества мусорных баков для бытовых отходов; Своевременный вывоз бытовых отходов с территории ЦОВ на основе договора об оказании услуг по вывозу и размещению отходов	Помещения ЦОВ	Осмотр помещений ЦОВ; Проверка наличия и действительности договора на вывоз и размещение отходов с муниципальным предприятием	Общий срок эксплуатации объекта	Поддержание хороших санитарных условий в ЦОВ Ограничение загрязнения почвы, поверхностных и подземных вод	Администрация ЦОВ Государственный Центр санитарного эпидемиологического надзора; НСИФТ - Специалист по охране окружающей среды; НСИФТ - Специалист по МиО
Готовность к чрезвычайным ситуациям	Наличие системы пожарной сигнализации и локализации пожара, а также аварийных резервных систем для электроснабжения и водоснабжения Наличие плана реагирования на ЧС	Помещения ЦОВ	Периодические проверки : В рамках Плана реагирования на ЧС ежемесячные проверки пожарной безопасности должны проводиться специалистом СЭП для обеспечения надлежащего оснащения пожарных станций и сохранения полностью заряженных, хорошо смонтированных и работоспособных огнетушителей	Общий срок эксплуатации объекта	Снизить риски для персонала и пациентов ЦОВ; Избегать сбоев в предоставлении коммунальных услуг в ЦОВ	Администрация ЦОВ ответственный по ГО и ЧС; НСИФТ - Специалист по охране окружающей среды; НСИФТ - Специалист по мониторингу и оценке проекта.

Составил:

Главный специалист по экологическим и социальным мерам безопасности НСИФТ в городе Куляб

Саъдии Хайдар

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ

«ЛОИҲАИ ТАҶКИМИ УСТУВОРИИ ИҶТИМОЙ-ИҚТИСОДӢ»

«Socio-Economic Resilience Strengthening Project»

ПРОТОКОЛИ

Семинар-машварат оид ба муҳокимаи ҳуҷҷати «Нақшаи идоракунии чораҳои экологӣ ва иҷтимоӣ» (НИЧЭИ) барои татбиқи зерлоиҳаи **SERSP-1C-01** "Таъмири асосии 3 синфхона барои бунёди маркази омӯзиши ҷавонон дар бинои Маркази омӯзиши калонсолон дар кӯчаи 1-Май 12, шаҳри Кӯлоб" (азнавсозии як ҳуҷраи кории муассиса ба нуқтаи санитарӣ).

Санаи баргузорӣ:

«10» январи соли 2022

Чой баргузорӣ машварат: Маркази омӯзиши барои ҷавонон дар бинои Маркази омӯзиши калонсолон

Мақсад: Шиносоӣ намудани ҷомеа ва ҷонибҳои ҳавасманд бо нақшаи идоракунии чораҳои экологӣ ва иҷтимоии бехатарӣ "Таъмири асосии 3 синфхона барои бунёди маркази омӯзиши ҷавонон дар бинои Маркази омӯзиши калонсолон дар кӯчаи 1-Май 12, шаҳри Кӯлоб" (азнавсозии як ҳуҷраи кории муассиса ба нуқтаи санитарӣ), дар доираи татбиқи (Лоиҳаи таҷкими устувории иҷтимоӣ-иқтисодӣ).

Иштирок намуданд: Намояндагони Намояндагии Бунёди миллии иҷтимоии маблағгузории Тоҷикистон дар шаҳри Кӯлоб:

- Саъдии Ҳайдар - сармутахассис оид ба чораҳои бехатарии экологӣ ва иҷтимоӣ дар Намояндагии БМИМТ дар шаҳри Кӯлоб;
- Усмонҷони Нурулло - сармутахассис-муҳандис оид ба назорати техникаи лоиҳаҳо дар намояндагии БМИМТ дар шаҳри Кӯлоб;
- Маҳмадалиева Меҳрубон - сармутахассис оид ба рушди ҷомеа ва кор бо ҷавонон Намояндагии БМИМТ дар шаҳри Кӯлоб;
- Гулиева Фотима - сармутахассис оид ба харид дар намояндагии БМИМТ дар шаҳри Кӯлоб
- Алихонов Ҷумахон - сармутахассис-муҳандис оид ба назорати техникаи лоиҳаҳо дар намояндагии БМИМТ дар шаҳри Кӯлоб.

Рӯзномаи семинар-машварат:

1. Маълумоти умумӣ дар бораи "Лоиҳаи таҷкими устувории иҷтимоӣ-иқтисодӣ";
2. Маълумот дар бораи зерлоиҳаи "Таъмири асосии 3 синфхона барои бунёди маркази омӯзиши ҷавонон дар бинои Маркази омӯзиши калонсолон дар кӯчаи 1-Май 12, шаҳри Кӯлоб" (азнавсозии як ҳуҷраи кории муассиса ба нуқтаи санитарӣ);
3. Муаррифӣ ва баррасии ҳуҷҷати «Нақшаи идоракунии чораҳои экологӣ ва иҷтимоӣ» (НИЧЭИ) барои татбиқи зерлоиҳаи **SERSP-1C-01**;
4. Фаҳмондадиҳи дар бораи бемории сироятии COVID-19;
5. Таҳлилу музокираҳо ва ҷамъбасти натиҷаҳои семинар-машварат.

«ЛОИҲАИ ТАҲКИМИ УСТУВОРИИ ИҶТИМОЙ-ИҚТИСОДӢ»
«Socio-Economic Resilience Strengthening Project»

Семинар-машваратро бо суҳанҳои муқаддимаӣ Алихонов Ҷумаҳон, сармутахассис-муҳандис оид ба назорати техники лоиҳаҳо дар намояндагии БМИМТ дар шаҳри Кӯлоб кушод. Номбурда ҳозиринро бо рӯзномаи семинар-машварат шинос намуда, иброз дошт, ки дар ин ҷамъомад ҳуҷҷати «Нақшаи идоракунии чораҳои экологӣ ва иҷтимоӣ» (НИЧЭИ) барои амалисозии зерлоиҳаи **SERSP-1C-01** "Таъмири асосии 3 синфхона барои бунёди маркази омӯзиши ҷавонон дар бинои Маркази омӯзиши калонсолон дар кӯчаи 1-Май 12, шаҳри Кӯлоб" (азнавсозии як ҳуҷраи кории муассиса ба нуқтаи санитарӣ), мавриди баррасӣ қарор гардида, фикру мулоҳизаҳои иштирокчиён доир ба ин ҳуҷҷати мазкур зарур мебошад.

Сапас, оид ба масъалаи якуми рӯзномаи машварат оид ба «Лоиҳаи таҳкими иҷтимоӣ-иқтисодӣ» (ЛТУИИ) Усмонҷони Нурулло, сармутахассис муҳандис оид ба назорати техникий лоиҳаҳо дар шаҳри Кӯлоб ба иштирокчиёни семинар-машварат маълумоти умумӣ расонида, дар хотима такроран қайд намуд, ки мақсади асосии "Лоиҳаи таҳкими устувори иҷтимоӣ-иқтисодӣ" баланд бардоштани сифат ва тавсия дастрасӣ ба хизматрасониҳои таъминоти неруи барқ, инфрасохтори иҷтимоӣю иқтисодӣ ва мусоидат намудан ба таҳкими иқтисодии худидоракунии маҳаллӣ дар ҳудуди ҷамоатҳои фарогири лоиҳа мебошад.

Сармутахассис-муҳандис оид ба назорати техникий лоиҳаҳо дар намояндагии БМИМТ дар шаҳри Кӯлоб, Алихонов Ҷумаҳон ба иштирокчиёни машварат насбати рӯзномаи дуюми семинар-машварат оид ба таҳияи зерлоиҳаи **SERSP-1C-01** "Таъмири асосии 3 синфхона барои бунёди маркази омӯзиши ҷавонон дар бинои Маркази омӯзиши калонсолон дар кӯчаи 1-Май 12, шаҳри Кӯлоб" (азнавсозии як ҳуҷраи кории муассиса ба нуқтаи санитарӣ), ва татбиқи он маълумоти муфассалро пешкаш намуд.

Рузномаи сеюми семинар-машварат, ки мақсади асосии гузаронидани чорабиниҳои мазкур ба хотири баррасӣ намудани ҳуҷҷати таҳиягардида оид ба «Нақшаи идоракунии чораҳои экологӣ ва иҷтимоӣ» (НИЧЭИ) барои татбиқи зерлоиҳаи **SERSP-1C-01** мебошад, ки муаррифии онро сармутахассис оид ба чораҳои экологӣ ва иҷтимоӣ дар намояндагии БМИМТ дар шаҳри Кӯлоб, Саъдии Ҳайдар дар сатҳи касбӣ гузаронида, тавассути слайдҳо тамоми ҷузъиёти ҳуҷҷати мазкурро бо чораҳои пешниҳодшаванда ҷиҳати пешгирӣ ва паҳн намудани таъсири манфии оқибатҳои эҳтимолии экологӣ ва иҷтимоиро қадам ба қадам ба иштирокчиёни машварат манзур намуд. Ин чунин қайд намуд, ки рафти корҳои сохтмонӣ оид ба **азнавсозии як ҳуҷраи кории муассиса ба нуқтаи санитарӣ** нисбати татбиқи зерлоиҳаи **SERSP-1C-01** метавонад боиси таъсири экологӣ марбут ба садо, ҷанг, ҳаво ва об, идоракунии партовҳои саҳт, таназули гуногунии биологӣ, бехатарӣ ва саломатӣ шаванд, ки таҳияи ин ҳуҷҷати мазкур пешгирии ин падидаҳо мебошад. Дар баробари ин ҳар як шаҳрванд метавонад дар доираи амалишавии на танҳо зерлоиҳаи **SERSP-1C-01**, балки дар татбиқи «Лоиҳаи таҳкими устувори иҷтимоӣ-

«ЛОИҲАИ ТАҲКИМИ УСТУВОРИИ ИҚТИМОЙ-ИҚТИСОДӢ»
«Socio-Economic Resilience Strengthening Project»

иқтисодӣ» (ЛТУИИ) пешниҳод барои беҳтар намудани раванди татбиқ ё барои арзу шикоят ба БМИМТ ва Бонки Умумиҷаҳонӣ муроҷият намояд. Барои ин масъала механизми бозгашти алоқа ва телефонҳои ҳатҳои гарм вучуд дорад. Ҳаммаи амалҳои пешбинигардидаи ҳуҷҷати НИЧЭИ доираи қонунгузориҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон ва бо тартибу низомномаҳо ва стандартҳои иҷимой ва экологии Бонки Умумиҷаҳонӣ таҳия гардидааст, гуфт дар охири баромадаш Саъдии Ҳайдар.

Нисбати рӯзномаи чоруми семинар-машварат, Махмадалиева Меҳрубон, сармутахассис оид ба рушди ҷомеа ва кор бо ҷавонон Намояндагии БМИМТ дар шаҳри Кӯлоб, баромад оиди COVID-19 тавассути слайдҳо тамоми пешгири аз вирусӣ мазкуро пешкаши ҳозирин намуд.

Рӯзномаи панҷуми семинар-машварат ба таҳлилу музокираҳо нисбати ҳуҷҷати «Нақшаи идоракунии ҷораҳои экологӣ ва иҷтимоӣ» (НИЧЭИ) бо иштирокчиён барпо гардид ва аз тарафи иштирокчиён саволҳои зерин ба миён омаданд:

- Ҷонишини директори Ф.М.Д.М. Т.К.Т. Бахтиёр Нурматов, савол дод, ки роҳрав барои рафтани ба нуқтаи санитарӣ, ки аз тарафи Шумо ин нуқтаи санитарӣ сохта мешавад барои инвалидон ба назар гирифта шудааст? Сармутахассис-муҳандис оид ба назорати техникӣ лоиҳаҳо дар намояндагии БМИМТ дар шаҳри Кӯлоб Алихонов Ҷумахон ҷавоб доданд, ки мо дар шаҳри Кӯлоб чунин маркази омӯзиши ҷавонон дар ду қисмати шаҳр ба нақша гирифтаем. Шахсоне, ки имконияти маҳдуд доранд метавонанд аз Муассисаи таҳсилоти таълими иловагӣ, ки дар хиёбони С. Сомонӣ дар ошонаи якум ҷойгир мешавад, истифода баранд.

- Сармуҳосиби Ф.М.Д.М.Т.К.Т. Нуров Достӣ пурсид, ки об аз куча гирифта мешавад ва чи тавр захира карда мешавад, барои истифодабарии нуқтаи санитарие, ки Шумо ба нақша гирифтаед? Сармутахассис-муҳандис оид ба назорати техникӣ лоиҳаҳо дар намояндагии БМИМТ дар шаҳри Кӯлоб Усмонҷони Нурулло ба савол чунин ҷавоб гардонид, ки дар лоиҳаи нуқтаи санитарӣ барои нигоҳдори ва таъмини об як манораи фишордори об дар баландии 6 метр ба нақша гирифта шудааст, ки ба системаи нуқтаи санитарӣ пайваست карда мешавад.

- Донишҷӯи Ф.М.Д.М.Т.К.Т дар шаҳри Кӯлоб буда, Мусоева Дилором пурсид, ки дар ҳолати риоя нагардидани яке аз талаботҳои ҳуҷҷати НИЧЭИ дар рафти корҳои сохтмонӣ аз тарафи ташкилоти пудратчӣ чи бояд кард? Саъдии Ҳайдар, сармутахассис оид ба ҷораҳои экологӣ ва иҷтимоӣ намояндагии БМИМТ дар шаҳри Кӯлоб ҷавоб дод, ки дар ҳолати риоя нагардидани яке аз талаботҳои ҳуҷҷати НИЧЭИ дар доираи татбиқи зерлоиҳаи мазкур аз тарафи ташкилоти пудратчӣ, пурра корҳои азнавсозӣ як нуқтаи санитарӣ боздошта мешавад ва нисбати пудратчӣ ҷораҳои қатъӣ бояд андешида мешавад.



- Сипас дар охири ҷамбасти семинар-машварат такроран аз иштирокчиён пурсида шуд, ки ягон таклифи пешниҳодҳо барои ворид намудани ба ҳуҷҷати «Нақшаи идоракунии ҷораҳои экологӣ ва иҷтимоӣ» барои татбиқи зерлоиҳаи

«ЛОИҲАИ ТАҲКИМИ УСТУВОРИИ ИҶТИМОЙ-ИҚТИСОДӢ»
«Socio-Economic Resilience Strengthening Project»

SERSP-1C-01 "Таъмири асосии 3 синфхона барои бунёди маркази омӯзиши ҷавонон дар бинои Маркази омӯзиши калонсолон дар кӯчаи 1-Май 12, шаҳри Кӯлоб" (азнавсозии як ҳуҷраи кории муассиса ба нуқтаи санитарӣ) ҳаст, аммо аз тарафи иштирокчиён таклиф ва пешниҳод карда нашуд.


- Бо ҳамин семинар-машварат доир ба ҳуҷҷати НИЧЭИ барои амалишавии зерлоиҳаи **SERSP-1C-01** ба итмом расид ва намояндагони БМИМТ дар шаҳри Кӯлоб ба иштирокчиёни чорабинии мазкур изҳори миннадори баён намуданд.

Протоколро навишт:

10.01.2022 сол

ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ФОТО ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЙ

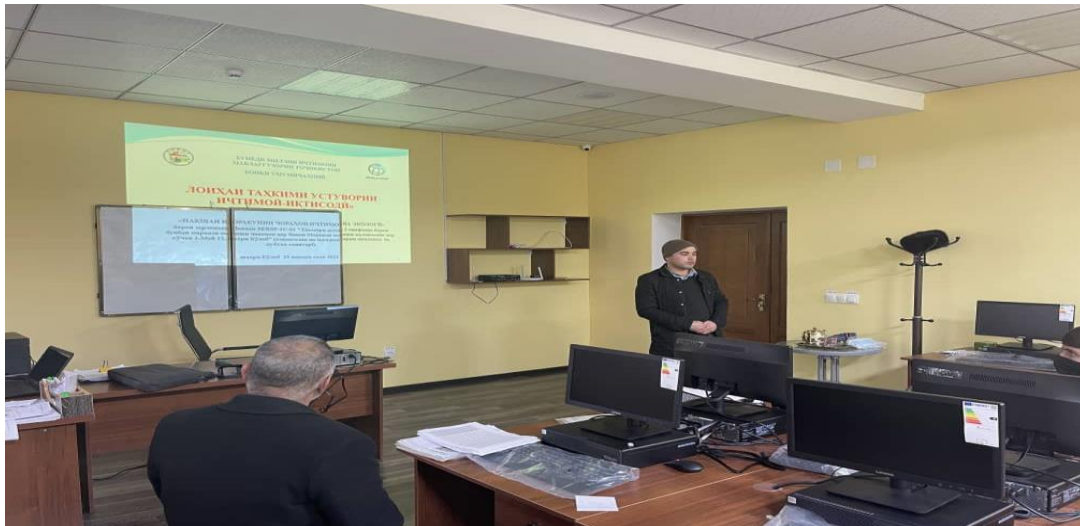

ПРИЛОЖЕНИЕ 3. СПИСОК УЧАСТНИКОВ

«ЛОИҲАИ ТАҲКИМИ УСТУВОРИИ И ҶИМОЙ-ИҚТИСОДӢ»
«Socio-Economic Resilience Strengthening Project»

Семинари машваратӣ

Дар мавзӯи: “Пешниҳоди ҳуҷҷати нақшаи идоракунии чораҳои экологӣ ва ҳифзи иҷтимоӣ” барои татбиқи зерлоиҳаи **SERSP-1C-01** “Таъмири асосии 3 синфхона барои бунёди маркази омӯзиши ҷавонон дар бинои Маркази омӯзиши калонсолон дар кӯчаи 1-Май 12, шаҳри Кӯлоб” (азнавсозии як ҳуҷраи кории муассиса ба нуқтаи санитарӣ).

Шаҳр/ноҳия: Кӯлоб

Сана: 10.01. 2022с.

Ҷойи баргузори: Дар Бинои Маркази омӯзиши калонсолон

Рӯйхати иштирокчиён

№	Ному насаб	Вазифа/ташкilot	Телефон	Имзо
1.	Шоҳруҳи Фаҳрӣ	Сармутоҳасиси Ф.М.ДМТН	918 661791	
2.	Сайдуллоҳ З	Некӯдагонӣ Кӯлоб	918 17 0154	
3.	Ҷамалова Гушара	Сармутоҳасиси Ф.М.ДМТН	985 35 2013	
4.	Ҷамалова Гушара	Донишмандӣ	066 444166	
5.	Ҷамалова Гушара	Донишмандӣ	909 09 2169	
6.	Ҷамалова Гушара	Донишмандӣ	987-45-34-25	
7.	Ҷамалова Гушара	Донишмандӣ	985-00-93-90	
8.	Ҷамалова Гушара	Донишмандӣ	985-35-35-43	
9.	Ҷамалова Гушара	Донишмандӣ	985-71-11-39	
10.	Ҷамалова Гушара	Донишмандӣ	988-26-3233	
11.	Ҷамалова Гушара	Донишмандӣ	918-24-54-17	
12.	Ҷамалова Гушара	Донишмандӣ	918 41 32 30	
13.	Ҷамалова Гушара	Донишмандӣ	985 53 53 67	
14.	Ҷамалова Гушара	Донишмандӣ		
15.	Ҷамалова Гушара	Донишмандӣ	918 5 0 8 6 7 8	
16.	Ҷамалова Гушара	Донишмандӣ	918 7 9 8 1 6 1	
17.	Ҷамалова Гушара	Донишмандӣ	90 8 8 0 8 3 7 8	
18.	Ҷамалова Гушара	Донишмандӣ	988-38-9688	
19.	Ҷамалова Гушара	Донишмандӣ	985 5 4 0 4 4 4 0 8	
20.	Ҷамалова Гушара	Донишмандӣ	988 6 7 5 2 0 2	
21.	Ҷамалова Гушара	Донишмандӣ	985-20-78-67	
22.	Ҷамалова Гушара	Донишмандӣ	985 2 1 0 0 2 1	
23.	Ҷамалова Гушара	Донишмандӣ	918 3 8 6 5 2 0	
24.				
25.				
26.				
27.				
28.				
29.				
30.				

Шахси масъул: Савдани Ҷ

Имзо:
